



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 001	Fecha Informe: 23-07-2021	Nombre De La Obra: Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina (3)	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

NO SE CONTO CON BITACORA

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: NINGUNO
- 2)MANTENIMIENTO VIAL: MITIGACIÓN DE POLVO DEL KM 103 AL KM 108
- 3)INCIDENTES: NINGUNO
- 4)ARQUEOLOGÍA: Hasta la fecha se han identificado 6 hitos pertenecientes al Ministerio de Cultura, que abarcan desde la progresiva del Km. 136+340 al Km. 137+040 los cuales delimitan la zona arqueológica monumental Huánucopampa, tramo camino inca ISCOPAMPA – Huánucopampa – Colpas y del Sitio Arqueológico Supaypunku que se encuentra interceptando la carretera en el área de derecho de vía, comprendiendo el emplazamiento de las estructuras arquitectónicas arqueológicas: del km. 110+320 al Km. 110+800
- 5)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:


MITIGACIÓN DE POLVO DURANTE EXCAVACIONES Y TRASLADO DE MATERIAL

Auditoria Fecha De Creación:

23-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-07-2021

Actividades:
UBICACIÓN DE LA PROGRESIVA: KM 129+002
EXCAVACIÓN PARA ESTRIBO DEL PUENTE AGOKUSHNA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA
MAQUINARIA (INCL.OPERADOR): 01 VOLQUETE Y 01 EXCAVADORA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-07-2021

Actividades:
UBICACIÓN DE TRAMO: KM 126+488 AL KM 126+420
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BACHES

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADOS: 03 PEONES, 01 VIGIA
SE UTILIZARON HERRAMIENTAS MANUALES Y 01 BUGUI

2



Foto2: **Foto3:**

Fecha Toma De Datos:
23-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 23-07-2021

Actividades:
UBICACIÓN DE TRAMO: KM 108+200 AL KM 108+100.
Corte de talud
Eliminación de desmonte

CDescripcion:
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIA, 01 AUXILIAR DE EXCAVADORA
MAQUINARIA (INCLUIDO OPERARIOS): 08 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA
PERSONAL POR PARTE DE SUPERVISIÓN: 01 AUXILIAR DE SUELOS Y PAVIMENTO, 06 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-07-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM125+672
SE PINTO CON PINTURA BITUMINOSA EL ESTRIBO IZQUIERDO

CDescripcion _____:
PUENTE ACUSHRAGRA

Foto1:



Foto2:

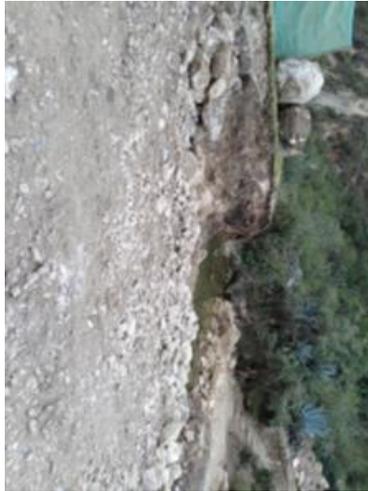


Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-07-2021

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 23-07-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: PUENTE JUPANHUAYRO KM 123+169.50
Encofrado del muro de pantalla del estribo derecho
Amarre de aceros verticales en el muro pantalla para estribo derecho

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADOS: 01 CAPATAZ, 06 OPERARIOS, 06 OFICIALES, 07 PEONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-07-2021

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL	Nivel: Moderado	Fecha De Fotografia: 23-07-2021
---	---------------------------	---

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 107+480 AL KM 107+510
Movimiento de tierra
Excavacion de roca suelta

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO, 01 AYUDANTE DE EXCAVADORA
MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUYENDO OPERARIOS): 01 EXCAVADORA, 06 VOLQUETES Y 01 MOTONIVELADORA

Foto1:	Foto2:	Foto3:
---------------	---------------	---------------

Fecha Toma De Datos:
23-07-2021

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 23-07-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM105+500.67
Trazo y Replanteo para ubicación de alcantarilla

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO : 01 TECNICO TOPOGRAFO Y 02 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA POR PARTE DE CONTRATISTA
CAMIONETA: 01 CONDUCTOR

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM103+560 AL KM103 +580
Perfilado

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON
MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUYENDO OPERARIOS): 01 EXCAVADORA Y 01
TRACTOR ORUGA

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021

8



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

UBICACION DEL TRAMO: KM103+400
Eliminación de excedente

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 GUIA
MAQUINARIA UTILIZADO (INCLUYENDO OPERARIOS): 01 EXCAVADORA Y 03
VOLQUETES

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021

9



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL Moderado 23-07-2021

Actividades:
UBICACIÓN DE TRAMO: KM102+970
Excavacion roca suelta y Material suelto

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 GUIAS
MAQUINARIA UTILIZADA (INCLUYENDO OPERARIO) : 01 EXCAVADORA

10

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
23-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-07-2021

Actividades:

UBICACIÓN DE TRAMO: KM 103 AL KM108
Riego de via para mitigacion de polvo

CDescripcion_____:

Foto1:



Foto2:



Foto3:

11

Fecha Toma De Datos:

23-07-2021
