



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 021	<b>Fecha Informe:</b> 27-07-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

**Foto Bitacora:**




**Foto Bitacora 2:**



**Foto Bitacora 3:**

**Foto Bitacora 4:**


**Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

NÚMERO DE INFORME 021, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.  
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.  
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

**Foto Bitacora 6:**





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL:

- SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°065 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°066 (SUPERVISOR DE OBRA)

2) RECURSOS OFERTADOS

• DEL CONTRATISTA

a. PERSONAL:

- SE ENCONTRO EN CAMPO, JEFE DE TOPOGRAFIA, 01 TECNICO EN TOPOGRAFIA,  
- SE ENCONTRO EN OFICINA, AL ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.

• DEL SUPERVISOR:

a. PERSONAL:

- SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO ASISTENTE, INGENIERO DE SEGURIDAD.

- SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

3) OTROS

- SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE), Y LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE.

- SEGÚN EL CRONOGRAMA DE OBRA LAS PARTIDAS: 202.A EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO, 201.B DESBROZE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, A LA FECHA AUN NO SE EJECUTAN (LAS CUALES ESTAN DENTRO DE LA RUTA CRITICA)., ASIMISMO LA PARTIDA 206.A PEDRAPLEN TAMPOCO SE ESTA EJECUTANDO.

• ACCIONES DEL CONTRATISTA:

- EL CONTRATISTA REMITE A SUPERVISION MEDIANTE LA CARTA N° 047 - 2021 - CVW, REFERIDO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA APROBACIÓN DEL EJE DE PROYECTO.

- EL CONTRATISTA REMITE A SUPERVISION LA CARTA N° 048 - 2021 - CVW REFERIDO A LA COPIA DEL TRAMITE REALIZADO ANTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ACARREO DE CANTERA CHECTUYOC 1 Y 2.

- EL CONTRATISTA REMITE A SUPERVISION LA CARTA N° 050 - 2021 - CVW, CON EL ASUNTO: CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

- EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE, POR FALTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LAS ÁREAS AUXILIARES, ESTA IMPOSIBILITADO DE DAR INICIO A LAS PARTIDAS CONTRACTUALES DESBROCE Y LIMPIEZA, EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO Y PEDRAPLÉN.

• ACCIONES DEL SUPERVISOR:

- LA SUPERVISION RECEPCIONA LA CARTA N° 047 - 2021 - CVW CON EL ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACION DEL EJE DE PROYECTO, LA CUAL SE DIO CONFORMIDAD MEDIANTE CARTA N° 016-2021-TEC4\_JS/PVN.

- LA SUPERVISION RECEPCIONA LA CARTA N° 050 - 2021 - CVW CON EL ASUNTO: CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO, LA CUAL MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA EN REVISION Y EVALUACION PARA EMITIR SU CONFORMIDAD.

- LA SUPERVISION REMITE A LA ENTIDAD LA CARTA N° 028-2021-TEC4\_RL/PVN CON EL ASUNTO: INFORME INICIAL DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

- LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA ELABORAR UN INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO (ITS), COMO INSTRUMENTO PARA LA MODIFICACIÓN DE ÁREAS AUXILIARES

**Recomendaciones:**

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS A PESAR DE LOS INCONVENIENTES, POR LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE AREAS AUXILIARES.

- SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR INFORME CON ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.

- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.

- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS OFERTADOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD EN OBRA.



Auditoria Fecha De Creación:  
27-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:  
28-07-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** SANDY DEISSY PRADO ALLENDE  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-07-2021

**Actividades:**  
PRUEBA EN LABORATORIO DE SUELOS  
LABORATORIO DEL CONTRATISTA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PRUEBAS DE ABRASION CON MAQUINA DE ABRASION LOS ANGELES.  
SE HIZO LA PRUEBA DE ABRASION DEL MATERIAL DE LA CANTERA CHECTUYOC

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
27-07-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** SANDY DEISSY PRADO ALLENDE  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-07-2021

**Actividades:**  
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE  
PROGRESIVA KM. 23+100


**CDescripcion:**  
MO: 02 ESPECIALISTAS DE MONITOREO  
SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

2

**Foto1:**



**Foto2:**

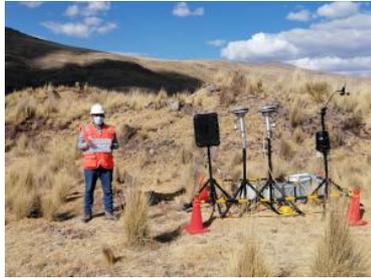

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
27-07-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

SANDY DEISSY PRADO  
ALLENDE

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-07-2021

**Actividades:**

TRAZO Y REPLANTEO  
PROGRESIVA 23+300

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

MO: 01 TOPOGRAFO, 03 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA  
SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE ALGUNAS AREAS EN EL TRAMO

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

27-07-2021

3





### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-07-2021

**Actividades:**

REUNION CON LA MONITORA DE ARQUEOLOGIA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PRESENTACION DE LA MONITORA DE ARQUEOLOGIA DONDE EXPLICO SUS FUNCIONES.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

27-07-2021
