



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 124-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 24-07-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME N° 124-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL SABADO 24 DE JULIO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

C) MAQUINARIA Y EQUIPO (INC. OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR

FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04 MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03 TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02

CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER, 02 CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE

ASFALTO TEREX MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPOGRAFOS

01 TÉCNICO DE COMPUTO

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

MANTENIMIENTO DE VIA: RIEGO PERFILADO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA TRAMO KM 130+000 AL KM 132+000

Recomendaciones:

NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

27-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 24-07-2021

Actividades:
UBICACION: EN EL TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 130+000 AL KM 131+000

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-07-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 24-07-2021

Actividades:
UBICACION: KM 130+000 AL KM 131+000

CDescripcion_____:
PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE LA PLATAFORMA.

2


Foto1:



Foto2:



Foto3:

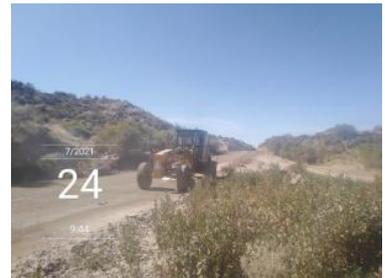

Fecha Toma De Datos:
26-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-07-2021

Actividades:

UBICACION: KM 131+000 AL KM 132+000

CDescripcion_____:

TRANSITABILIDAD DE LA VIA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-07-2021
