



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 023	Fecha Informe: 29-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

NÚMERO DE INFORME 023, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
 SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1) CUADERNO DE OBRA DIGITAL:
 - HASTA EL 27.07.2021 SE ENCUENTRA REGISTRADO EL ASIENTO N°065 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°066 (SUPERVISOR DE OBRA), A LA FECHA NO SE ACTUALIZO EL REGISTRO.
- 2) RECURSOS OFERTADOS
 - DEL CONTRATISTA
 - a. PERSONAL:
 - SE ENCONTRO EN CAMPO, 01 TECNICO EN TOPOGRAFIA.
 - SE ENCONTRO EN OFICINA: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, JEFE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, JEFE DE LABORATORIO, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES.
 - DEL SUPERVISOR:
 - a. PERSONAL:
 - SE ENCONTRO EN CAMPO: ESPECIALISTA RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, ASISTENTE TECNICO EN METRADOS COSTOS Y VALORIZACIONES.
 - SE ENCONTRO EN OFICINA: AL SUPERVISOR, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA, ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA.
 - 3) OTROS
 - SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS TRAZO Y REPLANTEO, LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS).
 - SEGÚN EL CRONOGRAMA DE OBRA LAS PARTIDAS: 202.A EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO, 201.B DESBROZE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS, A LA FECHA AUN NO SE EJECUTAN (LAS CUALES ESTAN DENTRO DE LA RUTA CRITICA)., ASIMISMO LA PARTIDA 206.A PEDRAPLEN TAMPOCO SE ESTA EJECUTANDO.
 - PARA EL DIA 30.07.2021 EL CONTRATISTA ACORDO UNA REUNION CON LOS PROPIETARIOS DE LAS AREAS AUXILIARES PARA LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE EL USO DE LAS DICHAS AREAS.
 - EL DIA DE HOY 29.07.2021 EL PERSONAL OBRERO Y TECNICO TRABAJO HASTA MEDIODIA.
 - ACCIONES DEL SUPERVISOR:
 - LA SUPERVISION EXIGE AL CONTRATISTA ELABORAR UN INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO (ITS), COMO INSTRUMENTO PARA LA MODIFICACIÓN DE ÁREAS AUXILIARES



Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR INFORME CON ANTICIPACION CUALQUIER LABOR DE EXTRACCION DE MATERIALES, REALIZACION DE ENSAYOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTROS.
- SE RECOMIENDA A LA SUPERVISION LA PRESENCIA DE LOS ESPECIALISTAS OFERTADOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD EN OBRA.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS PROGRAMADAS A PESAR DE LOS INCONVENIENTES, POR LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE AREAS AUXILIARES.
- SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO, PARA PREVENIR CONTAGIOS.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISION CUMPLIR SUS FUNCIONES DE ACUERDO A SUS CONTRATOS Y A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Auditoria Fecha De Creación:
29-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
30-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-07-2021

Actividades:
TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 27+ 298 A 28+198

CDescripcion_____:
MO: 01 TOPOGRAFO, 05 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA
SE CONTINUAN CON EL LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS)

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-07-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-07-2021

Actividades:

TRABAJO EN GABINETE

CDescripcion_____:

PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA Y SUPERVISION REALIZARON TRABAJO EN GABINETE

2

Foto1:

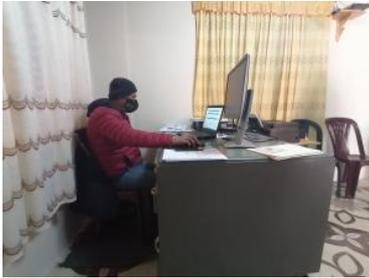


Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-07-2021

