


**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	008	03-08-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO- CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION- HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

NO SE CONTO CON EL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 6:

**Conclusiones:**


SE RESPETO EL PLAN SEMANAL COMO PARTIDA PRINCIPAL: VACIADO DE CONCRETO, Ubicación del tramo : Puente Jupanhuyro KM 123+169
INCIDENCIAS: La bomba que estaba designado para el vaciado tubo problemas de atascamiento; se pudo vizualizar que la mezcla estaba algo seca.

Recomendaciones:

Por parte de contratista revisar las maquinarias ante cualquier actividad
Por parte de supervisión revisar diseño de mezcla

Auditoria Fecha De Creación:
04-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:
05-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL**Nivel:**

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 123+169 Puente Jupanhuyro
Vaciado de concreto para estribo**CDescripcion_____:**

PERONAL UTILIZADO : 04 OPERARIOS, 01 CAPATAZ DE OBRAS DE ARTE, 02 PEONES

01 Ingeniero especialista en Puentes y obras de arte, 02 Ingeniero de seguridad por parte de contratista

01 Asistente de obras de arte , 02 controladores de obras de arte y 02 controlador de suelos y pavimentos , 01 auxiliar de laboratorio por parte de supervisión

Nota: La bomba se paralizó por tema de atascamiento, el vaciado se continuo mediante la instalación de chute.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

03-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: TALLER DE OBRA CIVIL
Slump: 8 pulgadas: 17 C°

CDescripción_____:

Primer mixer para el puente: Jupanhuaryro

Foto1:



Foto2:

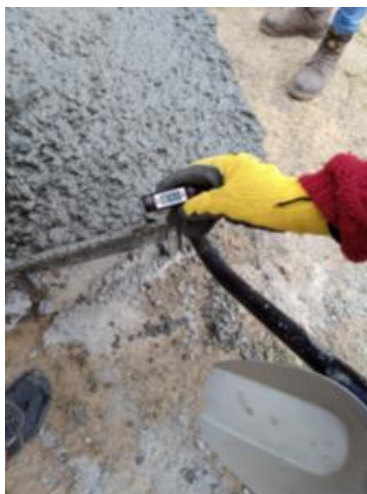


Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-08-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****03-08-2021****Actividades:****UBICACIÓN DEL TRAMO:** Taller de obras civiles
06 probetas por parte de supervisión
09 probetas por parte de contratista
Slump : 8 pulgadas**CDescripcion_____:****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****03-08-2021****3**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**Personal Encargado:**MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+510 AL KM 108+580

Corte de talud

Perfilado y Eliminación de material suelto

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 03 GUIA, 01 PEON Y 01 VIGIA

MAQUINARIA UTILIZADA: 03 EXCAVADORA (N° 2, 4, 6) Y 13 VOLQUETES (N° 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18)

NOTA: Los volquetes se están repartiendo con el tramo Km 108+650

4

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

03-08-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****03-08-2021****Actividades:****UBICACIÓN DEL TRAMO: KM108+650
Movimiento de tierra****CDescripcion_____:****MAQUINARIA UTIIZADA(INCLUYENDO OPERARIO) :01 Tractor oruga****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****03-08-2021****5**



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: Km 123+169
Vaciado de estrivo del Puente Jupanhuyro
Ultimo Mixer
Slum: 8"

CDescripcion_____:

Se intento vaciar con la bomba el penultimo mixer pero volvio haber atascamiento, se procedio a seguir el vaciado mediante la instalacion de chute.

6

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM125+672 Puente Acushagra
Verificación de nivel de fondo de cimentación del estribo derecho

CDescripción_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 TOPOGRAFO , 02 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA 01
PEON

MAQUINARIA (INCLUIÓ OPERARIO): 01 EXCAVADORA N°1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-08-2021
