



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	132- NAC M - ESC - DO PVN	05-08-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 132-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL JUEVES 05 DE AGOSTO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATISTA PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04

MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03

TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE

ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER, 02

CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 TÉCNICO DE COMPUTO

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

LA VIA ESTA TRANSITABLE, SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA

SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN

INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Recomendaciones:

LAS VIGIAS ESTAN USANDO CONOS DE SEGURIDAD, SE RECOMIENDA QUE UTILICEN CILINDROS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL DE TRAFICO.

Auditoria Fecha De Creación:

05-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

06-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAS KM 144+000 AL KM 145+000

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 144+000 AL KM 145+000

CDescripcion_____:

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA.


Foto1:



Foto2:



Foto3:

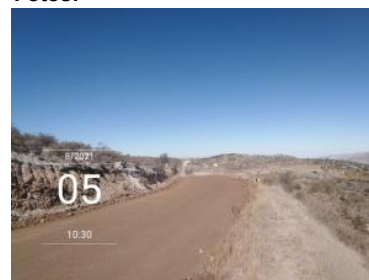

Fecha Toma De Datos:

05-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2021

Actividades:

UBICACION: KM 143+000 AL KM 145+000

CDescripcion_____:

DESENCALAMINADO DE LA VIA.

Foto1:

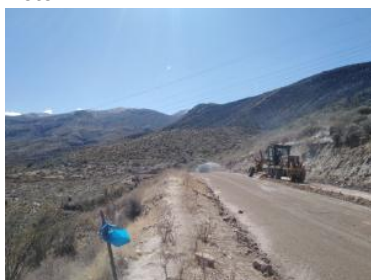


Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-08-2021
