



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	133-NACM-ESC-DO PVN	06-08-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

INFORME N° 133-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL VIERNES 06 DE AGOSTO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIA POR EL CONTRATISTA PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:**

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04

MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03

TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE

ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER,

02

CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX

MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a)PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 TÉCNICO DE COMPUTO

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b)OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

LA VIA ESTA TRANSITABLE, SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA

SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN

INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.



**Recomendaciones:**

NINGUNA.

**Auditoria Fecha De Creación:**

06-08-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

10-08-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-08-2021

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVAS KM 141+000 AL KM 142+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

06-08-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-08-2021

**Actividades:**  
UBICACION: TRAMO KM 141+000 AL KM 142+500


**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA PARA EL DESENCALAMINADO.

2

**Foto1:**



**Foto2:**

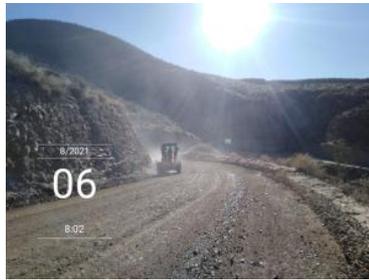

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-08-2021
