



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 006	Fecha Informe: 12-08-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N° 006-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:
Se informa que hasta la fecha 12.08.2021, no se ha actualizado el cuaderno de Obra.
2. OCURRENCIAS:
 - Se reitera que el cuaderno de obra debe ser llenado diariamente con el fin de verificar las actividades realizadas diariamente.
 - Según indica la supervisión el DME ubicado en el km 26+500, no esta disponible aun, pues falta autorización de SERFOR y ELECTROLUZ, para reubicación de los postes; indican que mientras los postes causen interferencias, no se podra usar como DME, por temas de seguridad; y por lo expuesto en el panel fotográfico.
 - Respecto a la Cantera y DME del km 24+600; el ALA, dio una respuesta negativa respecto al uso del espacio como CANTERA, sin embargo indicaron que pueden facilitar una autorización de uso temporal del área como DME, siempre y cuando no afecte su franja marginal.
 - Respecto a las coordinaciones con SERFOR, la especialista de la Supervisión hizo un recorrido del área para identificar cuales serían los sectores a verificar junto con los representantes de la entidad SERFOR.
 - Se observó que en los km del 23+000 al 30+500 no existe presencia de 01 cisterna de agua que atenúe el polvo ocasionado por vehículos que transitan, haciendo dificultoso el trabajo para las cuadrillas de topografía.

Recomendaciones:


- Se recomienda a las empresas contratista y supervisora llenar el cuaderno de obra diariamente, ya que ello permite conocer las actividades realizadas durante la jornada, asi como las ocurrencias.
- Se recomienda poner en funcionamiento la segunda cisterna de agua propuesta, ya que la polución en las áreas de trabajo es perjudicial y peligrosa.

Auditoria Fecha De Creación:

12-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

13-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico para elaborar secciones

CDescripcion_____:

Cuadrilla de topografía de la empresa contratista, que realizan el levantamiento topográfico para el diseño de plano de planta, perfil y secciones.

Al no contar con los implementos de seguridad, como arneses y otros para trabajos en altura; se encuentran tomando datos de los puntos cercanos hasta donde llega el alcance del equipo topográfico.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

Verificación final de BM

CDescripcion_____:

Una de las cuadrillas de topografía de la empresa contratista, realizaba la verificación final de los BM del proyecto.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-08-2021

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2021

Actividades:
Verificación de BM

CDescripcion_____:
El personal Técnico de Supervisión realizó trabajos de nivelación y verificación de BM, presentados por al empresa contratista.

3



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 12-08-2021
--	----------------------------	---

Actividades:
DME KM 26+500

CDescripcion_____:

Se observó que el área se encuentra delimitada con retazos de cinta de seguridad. Según señaló la supervisión, el área cuenta con la poligonal, ya que es un DME propuesto en el expediente técnico del proyecto; sin embargo requiere coordinar con SERFOR la autorización para desbroce y con ELECROLUZ, la interferencia de 03 postes de electricidad, ya que tendrían que ser removidos. Aun no se han realizado estas gestiones debido a que no se cuenta con el eje definitivo del proyecto, el cual permitirá a ambas instituciones delimitar la afectación del proyecto en sus instancias respectivas.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 12-08-2021
--	----------------------------	---

Actividades:
Asistencia de personal clave emp. Contratista

CDescripcion_____:

5

Registro de asistencia de personal clave, se observa que el personal no viene cumpliendo el registro diario de asistencia; y hasta la fecha no han querido entregar la Programación de salidas de su personal; así como los números telefónicos de los mismos.
El día de hoy se estuvo llamando al administrador de la empresa contratista, ya que el ing, residente se encontraba en campo; sin embargo tampoco atendió ni devolvió ninguna de las llamadas.

Foto1:	Foto2:	Foto3:
---------------	---------------	---------------

Fecha Toma De Datos:
12-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2021

Actividades:
Verificación de la BM y nivelación de terreno

CDescripcion_____:
El personal Técnico de Supervisión realizó trabajos de nivelación y verificación de BM, presentados por al empresa contratista, entre las progresivas del 23+000 al 30+500.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
12-08-2021

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo

CDescripcion_____:

EL control de emisión de polvo, se viene realizando con 01 ola cisterna de agua, entre las progresivas del 00+000 al 22+000; sin embargo en las progresivas que llegan hasta el 30+500, no se realiza el control de polvo; resultando peligros para el personal de topografía que realiza labores en esos sectores.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-08-2021

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

Asistencia supervision

CDescripcion_____:

Registro de asistencia de personal clave.

Foto1:



Foto2:

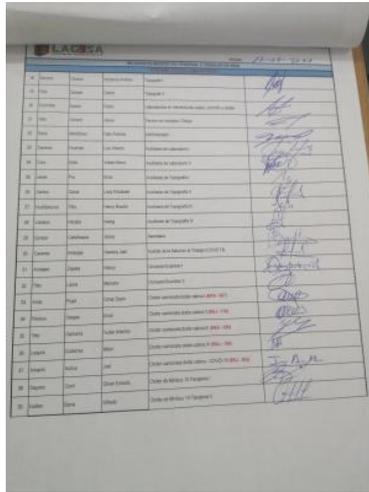


Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-08-2021
