

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 138-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 12-08-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME N° 138-NACM-ESC-DO PVN


REPORTE DEL JUEVES 12 DE AGOSTO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

SE TIENE LA PRESENCIA DE LOS INGENIEROS DE LA DIRECCION DE CALIDAD DEL PVN.

ING. KARINA BARREDA ESP. EN GEOLOGIA
ING. FERMIN PORRAS ESP. EN COSTOS Y PRESUPUESTOS.
ING. STIWARD ZALDAÑO ESP. EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA

ESTAN EVALUANDO ZONAS INESTABLES PARA CONSIDERARLOS EN LOS NUEVOS PAO.

Foto Bitacora 6:



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04 MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03

TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER, 02

CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPOGRAFOS

01 TÉCNICO DE COMPUTO

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

LA VIA ESTA TRANSITABLE, SE TIENE EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION ASI COMO TAMBIEN INTERVINIENDO EN LAS PROGRESIVAS RECOMENDADAS POR LA SUPERVISION.

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

13-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

13-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2021

Actividades:
UBICACION: KM 99+400

CDescripcion_____:
EVALUACION DE ZONAS INESTABLES POR LOS INGENIEROS DE LA DIRECCION DE CALIDAD DEL PVN.
ING. KARINA BARREDA ESP. EN GEOLOGIA
ING. FERMIN PORRAS ESP. EN COSTOS Y PRESUPUESTOS.
ING. STIWARD ZALDAÑO ESP. EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 39+360 AL KM 39+700

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

2


Foto1:



Foto2:



Foto3:

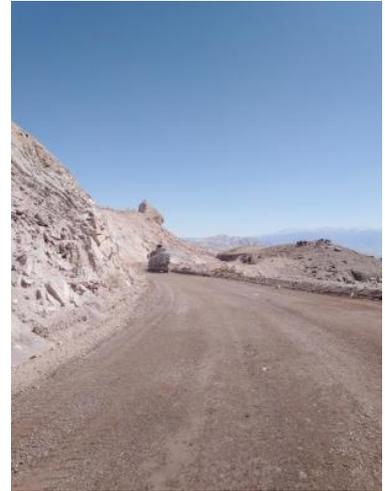

Fecha Toma De Datos:

13-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 39+820 AL KM KM 41+000

CDescripcion_____:
PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 75+780

CDescripcion_____:
INGENIEROS ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIONDE CALIDAD EVALUANDO ZONAS INESTABLES PARA GENERAR LOS PAO CORRESPONDIENTES.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2021
