



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                 |                            |                                     |   |  |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si | <b>Nro Informe:</b><br>013 | <b>Fecha Informe:</b><br>09-08-2021 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3 | <b>Personal Encargado:</b><br>MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|


**Foto Bitacora:** **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

No se obtuvo el cuaderno de obra

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

**Recomendaciones:**

**Auditoria Fecha De Creación:**

09-08-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

18-08-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-08-2021


**Actividades:**

nivelación sud rasante y perfilado  
km 103+500 hasta 600  
cargio hasta 540

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

01 capataz de movimiento 01 operario 01 oficial 02 ayudante

**Foto1:**

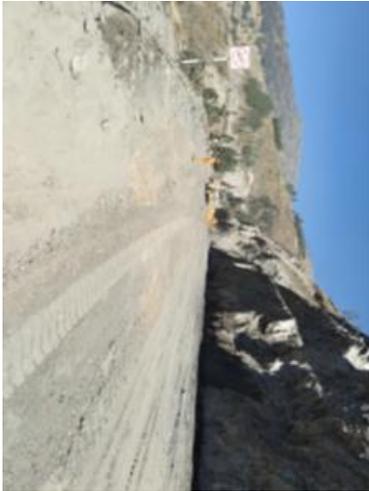

**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

09-08-2021

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 09-08-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 108+480 AL KM 108+520  
Corte de talud  
Perfilado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 operario, 01 ayudante y 01 vigia  
MAQUINARIA UTILIZADA ( INCLUIDO OPERARIO): 01 EXCAVADORA

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
09-08-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
MARÍA ALEJANDRA No Aplica 09-08-2021  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+169.50  
Desencofrado del muro del estribo derecho del puente Jupanhuyro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERARIOS

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
09-08-2021

3



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL No Aplica 09-08-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125+672.30  
Levantamiento topográfico del nivel de solado para zapata del estribo izquierdo Acushagra

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTIULIZADO : 01 TOPOGRAFO, 02 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA Y 02 PEONES

4



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
09-08-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
MARÍA ALEJANDRA No Aplica 09-08-2021  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+ 002.50  
Encofrado para zapata del estribo derecho del puente Agokushma

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 04 operarios carpinteros

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
09-08-2021

5
