




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	25	24-08-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	JANETH MONICA VARGAS RAMOS


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N°25-2021-TUNEL Y ACCESO/JMVR

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

2. SITUACIÓN ACTUAL:

- Continúa suspendido hasta el 31 de agosto del 2021.

- Está en proceso de subsanación de las causales que son:

o DMEs del 4+980 km y DMEs del 24+600 km. – Esta ratificado los documentos del 4+980 de los propietarios, Falta la autorización del DGAAM, falta definir la faja marginal en dichos kilometrajes. Se encontró:

? DME en 10 +000 km., está en proceso de regularización de documento y se terminó el levantamiento topográfico, el trazo de la carretera pasa en el terreno.

? DME en 222+147 km, está en proceso de regularización de documentos.

? Encuentro de nuevos DMEs: 0+900 km ; 1+600 km y 2+100 km; esta en evaluación.

o Canteras 4+980 km y Canteras 24+600 km. – Se tiene la ratificación de las autorizaciones del 4+980 km; Falta la opinión vinculante del ANA y autorización por el Municipio Distrital de Santa Teresa.

o Polvorín, localizado en 24+600 km.- Reubicación en 5+800 km, realizaron el levantamiento topográfico correspondiente, tiene el título de propiedad ratificado, falta adjuntar la documentación de aprobación de SUCAMEN, falta documentación de ITS.

o Planta Tratamiento de materiales, según expediente localizado en 4+980 km.:

? Está en proceso de regularización de documento del 4+980 km.

? Alternativa de solución 4+100 km la planta chancadora y a 800 m la planta de concreto, se tiene el levantamiento topográfico y autorización del propietario con su respectiva ratificación.

? En 10+000 km está en evaluación como alternativa de solución para la reubicación de planta industrial, se terminó el levantamiento topográfico, falta la regularización de documentos.

3. TRABAJOS SIGNIFICATIVOS:

• La supervisión realizó la visita a campo junto con el topógrafo de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, para coordinar el levantamiento topográfico del 4+980 km.

• El Consorcio Carretera Cusco, encontró 3 DMEs nuevos que son: 0+900 km, 1+600 km y 2+100 km; lo cual realizaron la visita a campo junto con el Consorcio Supervisor Santa Teresa, para la identificación y evaluación de los DMEs nuevos por parte de la supervisión.

4. OCURRENCIAS/PROBLEMÁTICA

• La Municipalidad Distrital de Santa Teresa, observo la CARTA CE N°050-2021/S.RNS (P), con asunto: Solicitud de autorización de Extracción de Material de Acarreo en Cauces Natural del Rio Vilcanota, las observaciones son las siguientes: pago por derecho de extracción de material, Declaración jurada del solicitante comprometedor a la preservación del medio ambiente, Plan de forestación y reforestación, y acta de inspección técnica por el especialista de la municipalidad. Dichas observaciones serán subsanadas por la supervisión.

5. PERSONAL OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. - Presentes obra son:

Personal Clave:

Jefe de supervisión: Enrique Jose Miguel Cox Cassinelli

Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones: Gerald Benavides Peralta

Especialista en Impacto Ambiental: David Salazar Yabar

Especialista en Administrador de contratos: Andrell Eguiluz Rivera.

Personal Auxiliar:

Asistente de hidrología: José Luis Cáceres Miranda

Asistente Técnico de topografía: Richar Chura Apaza

Asistente de Supervisor Ambiental: Cristian Martín Marquez Llerena

Arqueologa alterno: Catterina Garrido Condori.

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – El plantel técnico no está firmando el control de asistencia, debido a la suspensión de plazo de ejecución en obra.

6. MOVILIDAD OFERTADO:

SUPERVISOR- CONSORCIO SUPERVISORA SANTA TERESA. – Presentes en obra son:



Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- 01 Miniván
- 01 Camioneta

RESIDENCIA- CONSORCIO CARRETERA CUSCO. – No está firmando el control de asistencia por la suspensión de plazo de ejecución en obra.

- 01 Camioneta

Recomendaciones:

- Se recomienda a la supervisión, agilizar las documentaciones respectivas de las áreas auxiliares.
- Se recomienda cumplir con los protocolos de COVID-19.

Auditoria Fecha De Creación:


24-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

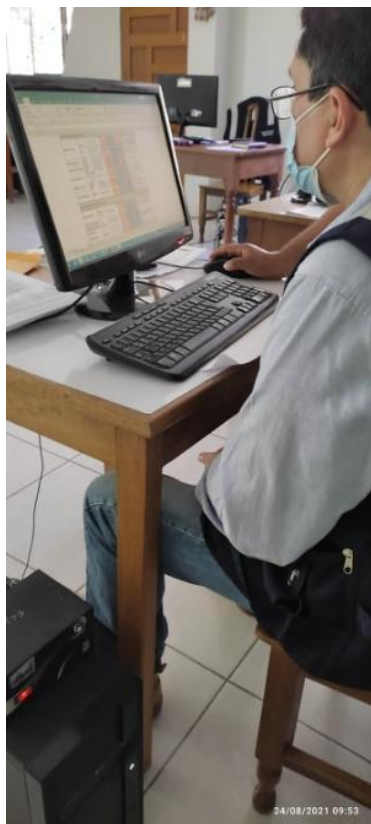Personal Encargado:**JANETH MONICA
VARGAS RAMOS****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****24-08-2021****Actividades:****Visita a la supervisión.****CDescripcion_____:****Visita a la oficina del Consorcio Supervisor Santa Teresa, donde se observa la supervisión en la subsanación de documentos.****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****24-08-2021**

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****J A N E T H M O N I C A
V A R G A S R A M O S****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****24-08-2021****Actividades:****Encuentro de DMEs nuevos****CDescripcion_____:****El Consorcio Carretera Cusco junto el Consorcio Supervisor Santa Teresa realizan la visita a campo para los DMEs nuevos localizados en 0+900 km, 1+600 km y 2+100 km.****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****24-08-2021****2**
