

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 018	Fecha Informe: 26-08-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

INFORME DIARIO N° 018-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:**1. CUADERNO DE OBRA:**

- No se obtuvieron las vistas del cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

- Se observó lluvia persistente durante todo el día.

- Se continuo con trabajos de acondicionamiento de vía y movimiento de Tierras entre los km del 24+000 al 25+500.

- Se continuó con trabajos de topografía entre los km 24+000 al 30+500

3. RECURSOS OFERTADOS**Del Contratista:**

a. Del personal ofertado: Se observa la ausencia del Ingeniero de Control de calidad propuesto en la oferta; también se observa que el Ingeniero de Producción se encuentra en sus días libres desde el 22.08 al 28.08.

b. Maquinaria y equipo:

Se observó 01 excavadora, 02 volquetes y 01 cargador frontal, 01 cisterna en el área de trabajo.

Del Supervisor:

c. Del personal ofertado: Se observa la ausencia de firma del, Especialista legal en Predios, a quien le corresponden sus salidas desde el día 31.08, según programación de salidas.

Se anotan los días libres considerados hasta fines del mes de agosto.

Especialista en Topografía y trazo de días libres (del 26.08 al 31.08)

Especialista en Control de calidad (del 25.08 al 31.08)

Especialista en Metrados y Costos de días libres (del 19.08 al 25.08)

Especialista en Impacto Ambiental de días libres (del 24.08 al 31.08)

Especialista en Seguridad de días libres (del 25.08 al 31.08)

Especialista Técnico en Liberación de Predios de días libres (del 20.08 al 31.08)

Especialista legal en Liberación de Predios de días libres (a partir del 31.08)

Especialista en Arqueología de días libres (del 24.08 al 31.08)

Recomendaciones:

- Se recomienda firmar las asistencias diariamente..



Auditoria Fecha De Creación:
26-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:
27-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 26-08-2021
--	----------------------------	---

Actividades:
Trabajos de Mov. Tierras

- CDescripcion** _____:
- 1 La excavadora realiza trabajos de corte en el km 24+500 aproximadamente, el material residual es trasladado al DME 26+500 con 02 volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2021

Actividades:
 Levantamiento topográfico

CDescripcion_____:

2

Las cuadrillas de topografía se encuentran realizando levantamiento topográfico para identificar las área de corte y limites de derecho de vía, que ayudará al área de PACRI para las gestiones que correspondan.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 26-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-08-2021

Actividades:
 DME 26+500

CDescripcion_____:

3

Se observa que los volquete, descargan el material de corte en el DME del km 26+500, y que este material es acomodado en el DME por un cargador frontal.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-08-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-08-2021


Actividades:

Asistencias 27.08

CDescripcion_____:


Se adjuntan los registros de asistencia de personal de empresa contratista y supervisión.

Foto1:

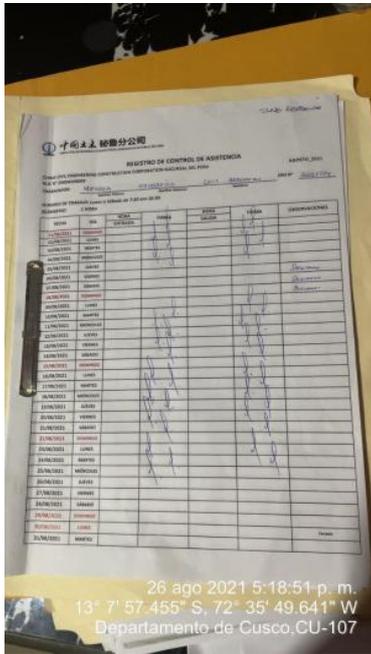

26 ago 2021 5:18:51 p. m.
13° 7' 57.455" S, 72° 35' 49.641" W
Departamento de Cusco, CU-107

Foto2:

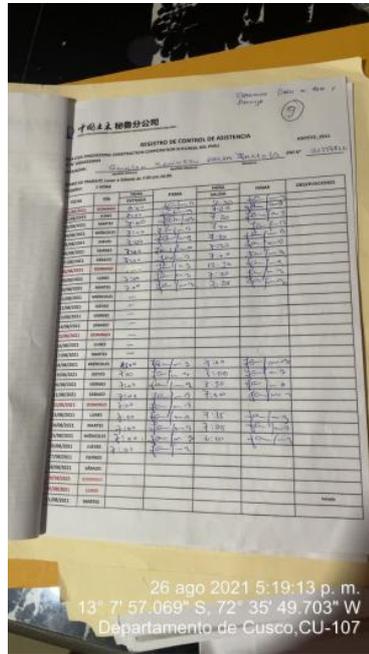

26 ago 2021 5:19:13 p. m.
13° 7' 57.069" S, 72° 35' 49.703" W
Departamento de Cusco, CU-107

Foto3:

LACSA		BOLESA DE MONTE DEL PUEBLO A TAMBORA DEL PUEBLO		FECHA: 26-08-2021
PROYECTO	ACTIVIDAD	PERSONAL	FECHA	REVISOR
1	Asistencia	Supervisión	26-08-2021	JK
2	Asistencia	Supervisión	26-08-2021	JK
3	Asistencia	Supervisión	26-08-2021	JK
4	Asistencia	Supervisión	26-08-2021	JK
5	Asistencia	Supervisión	26-08-2021	JK
6	Asistencia	Supervisión	26-08-2021	JK
7	Asistencia	Supervisión	26-08-2021	JK
8	Asistencia	Supervisión	26-08-2021	JK
9	Asistencia	Supervisión	26-08-2021	JK
10	Asistencia	Supervisión	26-08-2021	JK
11	Asistencia	Supervisión	26-08-2021	JK
12	Asistencia	Supervisión	26-08-2021	JK
13	Asistencia	Supervisión	26-08-2021	JK
14	Asistencia	Supervisión	26-08-2021	JK
15	Asistencia	Supervisión	26-08-2021	JK
16	Asistencia	Supervisión	26-08-2021	JK
17	Asistencia	Supervisión	26-08-2021	JK

Fecha Toma De Datos:

26-08-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-08-2021

Actividades:

Mitigación del polvo

CDescripcion_____:

5 01 Cisterna de agua entre los km 24+000 al 30+500 que realiza el mantenimiento de vía; sin embargo se resalta que por motivo de lluvias la vía se encontraba húmeda.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-08-2021
