



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 143-NACM-ESC-DO PVN	Fecha Informe: 18-08-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME N° 143-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MIERCOLES 18 DE AGOSTO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA : CASAPI - OHL

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA DE CUNETAS A CAUSA DE DESLIZAMIENTO DE PIEDRA Y TIERRA ENTRE LAS PROGRESIVAS
KM 84+420 AL KM 86+000

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04

MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03

TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE

ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER, 02

CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPOGRAFOS

01 TÉCNICO DE COMPUTO

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

DEBE EL CONTRATISTA LIMPIAR LAS ALCANTARILLAS Y OTRAS OBRAS DE ARTE.

Auditoria Fecha De Creación:

18-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-08-2021

Actividades:
UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 84+420 AL KM 86+000

CDescripcion_____:
LIMPIEZA DE CUNETAS

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-08-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-08-2021

Actividades:
UBICACION: TRAMO KM 84+420 AL KM 86+000

CDescripcion_____:
LIMPIEZA DE CUNETAS

2


Foto1:



Foto2:



Foto3:

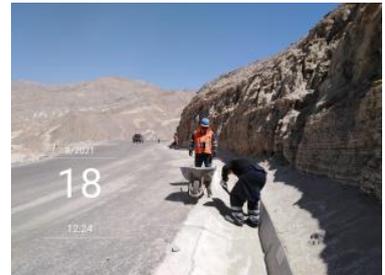

Fecha Toma De Datos:
 18-08-2021
