



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	026	25-08-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:





Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME N°026- TRAMO 3 - 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO 512 DE LA SUPERVISIÓN: EVALUACIÓN Y PROSPECCIÓN DE CANTERAS

ASIENTO 513 DE LA SUPERVISIÓN: VACIADO ZAPATA ESTRIBO DERECHO PUENTE ACUSHAGRA

ASIENTO 514 DE LA SUPERVISIÓN: ENTREGA DE PLANO DESVIO TEMPORAL DE ENTRADA DE TUNEL Y PROGRAMA DE TRABAJO DEL DISEÑO DE CONCRETO Y SHOTCRETE DE TUNEL

ASIENTO 515 DE LA SUPERVISIÓN: PLAN DE CONSTRUCCIÓN DEL TUNEL HUACTAHUARU

ASIENTO 516 DEL CONTRATISTA: CAPACITACIÓN DEL EQUIPO USSOMARCA A LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO DE PACHAS

INCIDENTES: NINGUNO

Recomendaciones:


SE RECOMIENDA PONER LAS PENALIDADES DEL CASO DEBIDO A QUE LAS CISTERNAS AUN SIGUEN HACIENDO RIEGO POR GRAVEDAD

Auditoria Fecha De Creación:

25-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-08-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 105 + 500
Quinta capa de relleno para alcantarilla 48"

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADA: 04 PEONES Y 01 CAPATAZ
01 AUXILIAR DE LABORATORIO POR PARTE DEL CONTRATISTA
01 CONTROLADOR DE SUELOS Y PAVIMENTOS Y 02 AUXILIARES DE
LABORATORIO

1

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****25-08-2021****Actividades:****UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 109+040****Corte de talud****Eliminación de materiales****CDescripcion_____:****PERSONAL UTILIZADO: 01 Capataz y 01 Peon****MAQUINARIA UTILIZADA: 01 Excavadora y 03 Volquetes****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****25-08-2021****2**

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:**MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****25-08-2021****Actividades:****UBICACIÓN DEL TRAMO: KM118+320 hasta KM118+380
Mantenimiento vial****CDescripcion_____:****PERSONAL UTILIZADO: 03 Peones y 02 Vigias****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****25-08-2021**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123

Excavacion para zapata del estribo izquierdo del puente Jupanhuaryro

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 Capataz y 03 Peones

MAQUINARIA UTILIZADA : 01 PICOTON

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:****MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL****Nivel:****No Aplica****Fecha De Fotografia:****25-08-2021****Actividades:****UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+530.53
Excavación para alcantarilla 48 "****CDescripcion_____:****PERSONAL UTILIZADA: 03 PEONES
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:****25-08-2021****5**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-08-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM103+363.16

Levantamiento topografico de fondo de excavación para alcantarilla de 48"

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 TOPOGRAFO, 02 AUXILIARES DE TOPOGRAFIA Y 02
PEONES01 CONTROLADOR DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE Y 01 TOPOGRAFO POR
PARTE DE SUPERVISIÓN

6

Foto1:

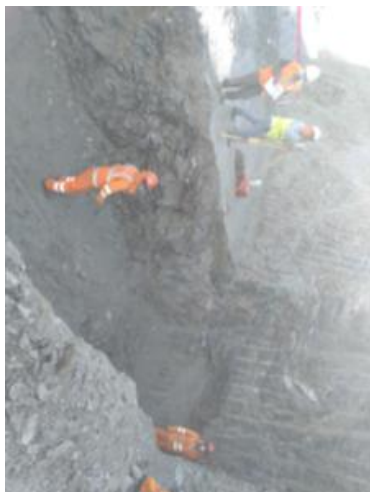


Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-08-2021
