



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 020	Fecha Informe: 28-08-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:





Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N° 020-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

- Se actualizó el cuaderno de obra hasta la fecha 27.08.
- En el asiento N° 135, del Contratista, (de fecha 27.08.21). El contratista señala que existe Falta de disponibilidad de Áreas Auxiliares para Planta Chancadora, Planta de asfalto, Planta de concreto, Patio de Maquinarias, Campamentos y Polvorin.

Además señala que el área dispuesto para este fin en el expediente técnico, ubicado en el km 24+600, se encuentra en la franja marginal, por lo cual solicita a la Entidad pronunciarse al respecto; ya que es de suma importancia para cumplir la programación.

2. OCURRENCIAS:

- Se observó trabajos de excavación con 01 excavadora, 01 cargador frontal y 03 volquetes entre los km 24+690 al 24+900.
- Se observaron 02 cisternas de agua, regando la vía.
- Se observaron cuadrillas de topografía de la supervisión y la contratista.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 28.08.2021.

- Residente
- Especialista en obras de arte
- Especialista en Geotecnia
- Especialista en suelos y pavimentos
- Especialista ambiental
- Jefe de oficina técnica
- Especialista en topografía
- Jefe de oficina de ingeniería

b. Maquinaria y equipo:

Se observó 02 cisternas de agua, 01 excavadora, 03 volquetes y 01 cargador frontal en el área de trabajo.

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 28.08.2021.

- Jefe de supervisión
- Especialista en suelos y pavimentos
- Especialista en metrados y costos
- Especialista en geología y geotecnia
- Especialista en Hidrología e Hidráulica
- Especialista en administración de contratos
- Responsable de la salud en el trabajo

Recomendaciones:

- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente

Auditoria Fecha De Creación:

29-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

30-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico

CDescripcion_____:

Se observó al personal de la empresa contratista (01 topógrafo, 01 ayudante de topografía y 02 jaloneros) realizando levantamiento topográfico de la posible ampliación del DME en el km 26+500.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-08-2021

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo (km 24+000 al km 27+000)

CDescripcion_____:

Se observó 01 cisterna de agua, entre los km 24+000 al km 27+000 regando la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-08-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

Nivelación

CDescripcion_____:

Se observó al personal de topografía de la Supervisión realizando verificación de ejes del proyecto desde el km 25+000 al km 30+500.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-08-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

Trabajos de excavación y corte de material suelto y rocas fragmentadas.

CDescripcion_____:

Se observó trabajos de excavación y corte en el km 24+680 aproximadamente, con 01 excavadora, 01 cargador frontal y 03 volquetes (el 3º volquete inició sus actividades aproximadamente a las 11.00 am.)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-08-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021

Actividades:

Control de emisión de polvo (Km 00+000 al km 22+000)

CDescripcion_____:

Se observó 01 cisterna de agua entre los km 00+000 al km 22+000 regando la vía.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

29-08-2021

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-08-2021


Actividades:

Asistencia supervisión y emp. contratista 28.08

CDescripcion_____:

Registro de asistencias de personal 28.08

Foto1:

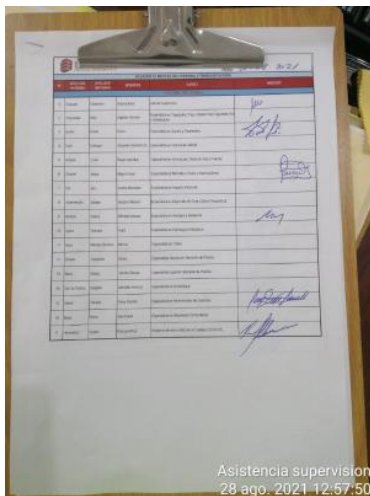


Asistencia supervision
28 ago. 2021 12:57:50

Foto2:



Asistencia supervision
28 ago. 2021 12:58:01

Foto3:

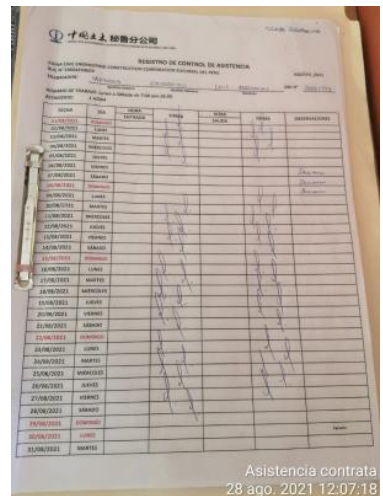

Asistencia contrata
28 ago. 2021 12:07:18

Fecha Toma De Datos:

29-08-2021
