

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 042	<b>Fecha Informe:</b> 14-09-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	<b>Personal Encargado:</b> MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

NO SE OBTUVO EL CUADERNO DE OBRA

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

Se tuvo reunion general por parte de supervisión y contratista, los temas que se trataron fueron lo siguiente:

PACRI: liberación de predios y Liberarion del KM 144 al Km 146 ( ubicación del tunel)

ARQUEOLOGIA: Puente charan KM 140+700 , falta evaluacion de descarte por parte de la DDC de Ancashy restricción arqueologica entre los KM 109 AL KM 110, falta verificación por parte de la DDC de Huanuco

OBRAS DE ARTE Y PUENTES: : Puente ubicado en el KM 104 y KM 105 en ambos la cimentación esta por encima del NAME

EQUIPOS Y MAQUINARIA: falta de equipos por parte del contratista  
Mantenimiento Vial

**Recomendaciones:**


Se recomienda que por parte de los especialista de PACRI del MTC, den mas enfoque al tema de liberaciones y con mayor predominancia entre los KM 144 al KM 146

**Auditoria Fecha De Creación:**

17-09-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

17-09-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-09-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+060  
Relleno y compactación en alcantarilla TMC 36"- sexta capa-salida

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 02 OPERARIOS Y 02 PEONES  
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA NEUMATICO

1



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
14-09-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-09-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 103+850 AL KM 103+860  
Corte de talud

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 GUIA  
MAQUINARIA UTILIZADA ( INCLUIDO OPERADOR): 01 EXCAVADORA Y 11 VOLQUETES

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
15-09-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

14-09-2021

**Actividades:**

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 104+720  
Eliminación de corte


**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO  
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA

**Foto1:**



**Foto2:**

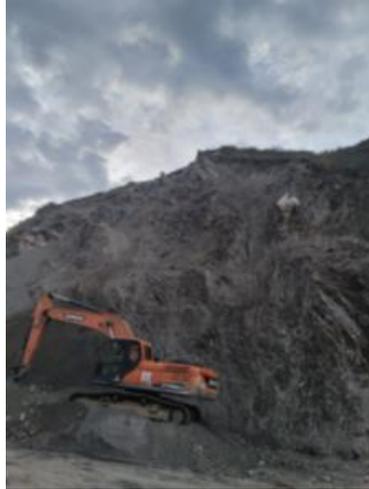

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

16-09-2021

3
