



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 038	<b>Fecha Informe:</b> 17-09-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	<b>Personal Encargado:</b> NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

INFORME DIARIO N° 038-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

**Foto Bitacora 6:**





**Conclusiones:**

**1. CUADERNO DE OBRA:**

- No se actualizó el cuaderno de Obra.

**2. OCURRENCIAS:**

- Se observó trabajos de corte, excavación y carguío en el km 23+500.
- Se observó mantenimiento de vía y áreas de trabajo con cisternas de agua
- Se culminó el ACTA de verificación de puntos de acceso para uso temporal del DME 24+600, en el cual firmaron Funcionarios del ANA, Municipalidad de Santa Teresa, empresa Contratista y Entidad.

**3. RECURSOS OFERTADOS**

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 17.09.2021.

- Ingeniero Residente
- Responsable de contratos
- Especialista de Trazo y replanteo
- Ingeniero de producción
- Especialista de Suelos y pavimentos (falta firma)
- Especialista en geotecnia

b. Maquinaria y equipo:

- 02 cisterna de agua
- 03 excavadoras
- 09 volquetes
- 01 tractor sobre orugas
- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora
- 01 Cargador frontal

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 17.09.2021.

- Especialista en Topografía, trazo, diseño y seguridad vial
- Especialista en suelos y pavimentos
- Especialista en control de calidad
- Especialista en estructuras, obras de arte y puentes
- Especialista en metrados, costos y valorizaciones
- Especialista en impacto ambiental
- Especialista en geología y geotecnia
- Especialista en arqueología
- Especialista en hidrología e hidráulica
- Especialista en administración de contratos
- Especialista en relaciones comunitarias

**Recomendaciones:**

- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
- Se recomienda registrar las firmas diariamente

**Auditoria Fecha De Creación:**

17-09-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

20-09-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**


**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-09-2021

**Actividades:**  
Asistencias 17.09

**CDescripcion:**  
Se adjuntan registros de asistencia y control de T° de la empresa contratista y supervision 17.09

1

**Foto1:**

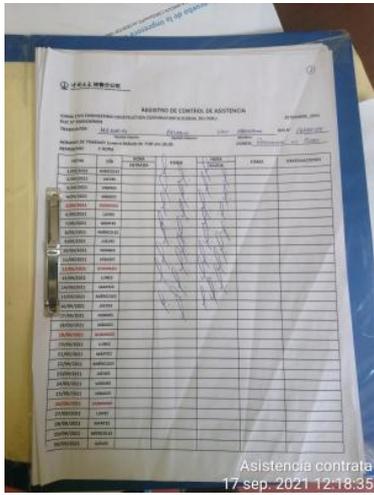

**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
17-09-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-09-2021

**Actividades:**  
Excavacion y carguio

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se observaron trabajos de excavacion y carguio en el km 23+500 con 02 excavadoras, 09 volquetes. (El recorrido hasta el DME 26+500, dura aprox. 40 minutos  
También se observó el regado de las áreas de trabajo con cisterna de agua

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-09-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**


**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-09-2021

**Actividades:**  
 Firma de ACTA del ANA


**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

Se finalizó el trámite de firma de ACTA entre funcionarios del ANA, Municipalidad de Santa Teresa, Representantes de la empresa contratista y de la entidad, para la autorización de accesos al uso temporal del DME 24+600.


**Foto1:**

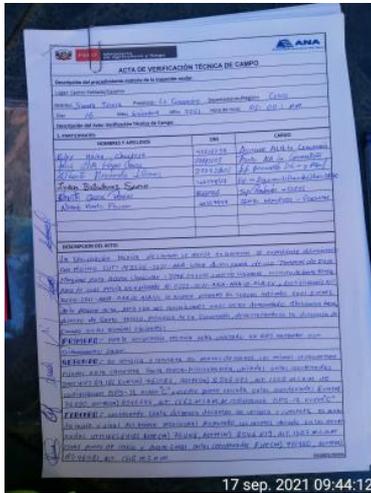

**Foto2:**

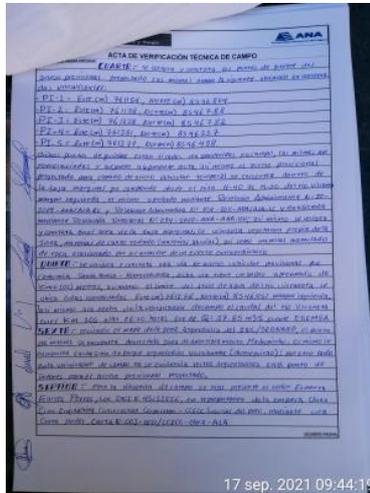

**Foto3:**

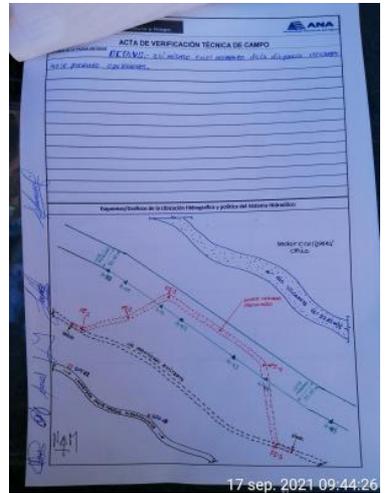

**Fecha Toma De Datos:**  
 19-09-2021

3



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-09-2021

**Actividades:**  
Mantenimiento de la vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Se observó al cisterna de agua controlando la emisión de polvo entre los km 0+000 al km 22+000

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
19-09-2021
