

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA


### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 045	<b>Fecha Informe:</b> 17-09-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	<b>Personal Encargado:</b> MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

NO SE OBTUVO EL CUADERNO DE OBRA

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

PACRI: Reunión con los pobladores de Pachas, se trataron los temas de compensación y boldera de trabajo; MTC PACRI (Ing. Donny Mendoza, Ing. Josue Zambrano), Supervisión y CR20  
ACCIDENTES: NINGUNO

**Recomendaciones:****Auditoria Fecha De Creación:**

20-09-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

21-09-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**


**Personal Encargado:** MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 17-09-2021

**Actividades:**  
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 125  
Relleno en el estribo izquierdo en el puente Acushragra  
Se detecto que el material estaba contaminado

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
Supervisión mando a detener la actividades hasta que el material sea cambiado o este limpio  
Personal utilizado: 02 operarios y 03 peones  
Maquinaria Utilizado: 01 Rodillo bermero

1

**Foto1:**

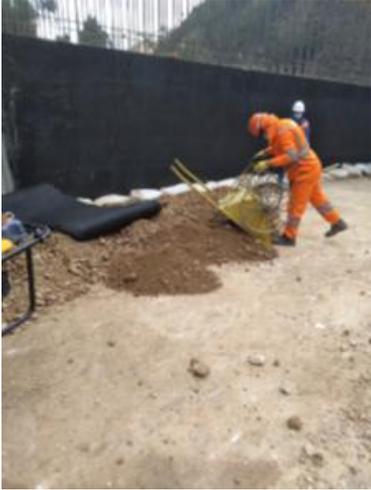

**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
17-09-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MARÍA ALEJANDRA  
MARIÁTEGUI CORONEL

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

17-09-2021

**Actividades:**

Ubicación del tramo: Estadio Municipal de Pachas

Personal reunido :Pacri MTC, Supervision ( Ing. Sandro LLana y Lic. Emilio Caldas) y Cr20 ( Ing.Edwin Flores)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

Temas que se tratarom:

Compensación y puestos de trabajo

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

17-09-2021
