



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 044	Fecha Informe: 24-09-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N° 044-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

No se actualizó el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

-Se observó la llegada de 05 volquetes marca Howo al campamento de la empresa Contratista.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 24.09.2021.

- Jefe de oficina técnica
- Especialista ambiental
- Especialista en geotecnia
- Especialista de Suelos y pavimentos (falta firma)
- Especialista de Trazo y replanteo (falta firma)

b. Maquinaria y equipo en obra:

Equipos en área de trabajo:

- 02 cisterna de agua
- 03 excavadoras (02 trabajando en el frente del km 23+500, y 01 en el km 25+700))
- 11 volquetes
- 01 tractor sobre orugas
- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora (parado en área de obra)
- 01 Cargador frontal

Equipos en campamento: (parados)

- 02 track drill
- 01 retroexcavadora
- 01 tracto de semitrailer
- 01 compresora
- 05 Volquete Howo

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 24.09.2021.

- Jefe de supervisión
- Especialista en suelos y pavimentos
- Especialista en impacto ambiental
- Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
- Especialista en geología y geotecnia
- Especialista en hidrología e hidráulica
- Especialista en arqueología
- Especialista en administración de contratos

Recomendaciones:

- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
- Se recomienda registrar las firmas diariamente. (el personal contratista no está firmando sus asistencias)

Auditoria Fecha De Creación:

26-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
24-09-2021

Actividades:
Asistencias 24.09

CDescripcion _____:
Se adjuntan registros de asistencias de la empresa contratista y supervisión 24.09

1

Foto1:

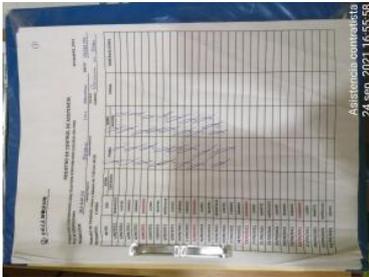


Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
24-09-2021

Actividades:
Campamento de empresa contratista

CDescripcion _____:
Se observó la llegada de 05 Volquetes Howo en el campamento de la empresa contratista que se encuentran parados junto a los 02 track drill, 01 compresora y 01 retroexcavadora.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-09-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-09-2021

Actividades:

Presentación de documento para autorización de uso de Cantera en Municipalidad de Maranura

CDescripcion_____:

Presentación de solicitud de autorización de explotación de cantera Derrumbe en la Municipalidad de Maranura.

Foto1:




Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

25-09-2021

3
