



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	161- NAC M - ESC - D O PVN	24-09-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 161-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL VIERNES 24 DE SETIEMBRE DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA LA
TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA : COSAPI - OHL

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL
RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 138+000 AL KM
143+000

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04

MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03

TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE

ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER,
02

CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX
MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a)PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 TÉCNICO DE COMPUTO

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b)OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS



Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

24-09-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-09-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-09-2021

Actividades:

UBICACION: KM 140+000 AL KM 143+000

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION
CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL
Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:



Foto2:

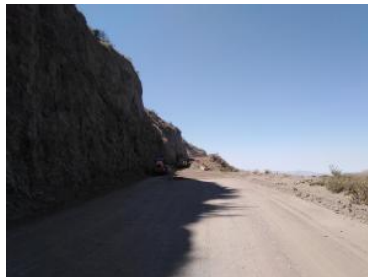


Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-09-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-09-2021

Actividades:

UBICACION: KM 138+000 AL KM 140+000

CDescripcion_____:

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO COMO MANTENIMIENTO DE VIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-09-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-09-2021

Actividades:

UBICACION: KM 138+000 AL KM 140+000

CDescripcion_____:

TRANSITABILIDAD DE LA VIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-09-2021
