



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                               |                                          |                |                                                                            |                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Confir<br>ma<br>Bitaco<br>ra: | Nro<br>Inform<br>e:                      | Fecha Informe: | Nombre De La Obra:                                                         | Personal Encargado:             |
| Si                            | 173-<br>NAC<br>M -<br>ESC<br>- DO<br>PVN | 08-10-2021     | Carretera Moquegua - Omate<br>- Arequipa Tramo: II km. 35 al<br>km. 153.50 | CUTIPA MONZON NESTOR<br>ARNULFO |

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

#### Asunto:

INFORME N° 173-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL VIERNES 08 DE OCTUBRE DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE - TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL  
CONSORCIO CONTRATISTA COSAPI-OHL

Foto Bitacora 6:

#### Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL  
RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 93+200 AL KM  
94+200

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01  
RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR  
FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04

MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03

TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE

ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER,  
02

CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX  
MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a)PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 TÉCNICO DE COMPUTO

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b)OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS



Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

08-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

09-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-10-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 93+200 AL KM 94+200

CDescripcion\_\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 VOLQUETE, 01  
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO  
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-10-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-10-2021

Actividades:

UBICACION: KM 93+200 AL KM 94+200

CDescripcion\_\_\_\_\_:

DESENCALAMINADO DE VIA COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO DE VIA.

Foto1:

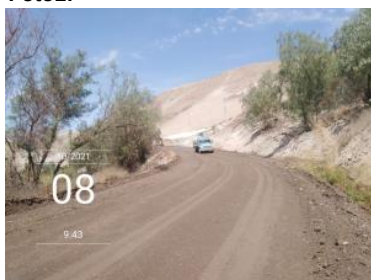


Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-10-2021

2
