



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 056	Fecha Informe: 08-10-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N° 056-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

No se actualizó el cuaderno de obra.

1. OCURRENCIAS:

-La empresa contratista cuenta con 03 frentes de trabajo, para movimiento de tierras, con excavadoras y volquetes.

- Km 23+400 (material suelto)
 - Km 24+800 (material suelto); conformación de la 2da banquetta
 - Km 25+900
- Regado de vía con 02 Cisternas de agua
-Trabajos de topografía
•Trazo y replanteo

2. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 08.10.2021.

- Ingeniero de producción
- Especialista de Suelos y pavimentos
- Jefe de oficina de ingeniería
- Especialista de Trazo y replanteo
- Jefe de oficina técnica
- Especialista ambiental
- Ingeniero responsable de contratos

b. Maquinaria y equipo en obra:

Equipos en área de trabajo:

- 02 cisterna de agua
- 04 excavadoras
- 16 volquetes
- 01 tractor sobre orugas
- 01 Rodillo Liso
- 01 Motoniveladora
- 01 Cargador frontal
- 01 Retroexcavadora

Para traslado de personal:

- 01 Bus de personal
- 04 combis
- 07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

- 02 track drill
- 01 tracto de semitrailer
- 02 compresoras
- 02 rodillos lisos
- 01 rodillo neumático
- 01 tractor sobre orugas
- 02 excavadoras

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 08.10.2021.

- Jefe de supervisión
- Especialista en topografía, trazo, diseño vial y señalización
- Especialista en metrados y costos
- Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional
- Especialista técnico en liberación de predios
- Especialista en administración de contratos
- Especialista en Relaciones Comunitarias
- Responsable de Salud en el trabajo

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

- 02 combis
- 05 camionetas



Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

11-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-10-2021

Actividades:

Equipos en campamento

CDescripcion_____:

Se observan 02 excavadoras, 02 rodillos lisos, 01 rodillo neumático y luminarias.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-10-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-10-2021

Actividades:

DME en el km 24+600

CDescripcion_____:

Actividades de relleno en el DME del km 24+600.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-10-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-10-2021

Actividades:
Asistencias 08.10

CDescripcion:
Se adjuntan las asistencias del contratista y controles de Tº y supervisor 08.10.21.

Foto1:



Foto2:

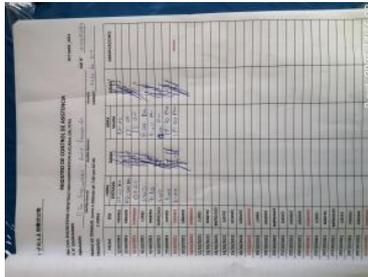


Foto3:

INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

Fecha Toma De Datos:
08-10-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-10-2021

Actividades:
 Corte y carguío en el km 24+700

CDescripcion:
 Actividades de corte de material suelto con excavadora y carguío con Cargador frontal y volquetes.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 08-10-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-10-2021

Actividades:
 DME km 26+500

CDescripcion:
 Actividades de relleno e material en DME del km 26+500.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-10-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-10-2021

Actividades:
Corte y carguío en el Km 23+500 aprox.

CDescripcion_____:
Actividades de corte y carguío de material suelto en el km 23+500 aprox.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-10-2021
