




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	061	14-10-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR


Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DIARIO N° 061-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA:

-No se actualizó el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

-La empresa contratista cuenta con 03 frentes de trabajo, para movimiento de tierras, con excavadoras y volquetes.

•Km 19+800 (trabajos de corte y carguío)

•Km 21+000 (termino de acondicionamiento de accesos para ingreso de volquetes al DME 24+600)

•Km 24+800 (con 02 turnos uno de día y otro de noche)

-Regado de vía con 02 Cisternas de agua

-Trabajos de topografía

•Trazo y replanteo

•Levantamiento topográfico de obras de arte

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 14.10.2021.

-Ingeniero residente

-Ingeniero de producción (falta firma)

-Especialista de Suelos y pavimentos

-Especialista en geotecnia

-Jefe de oficina de ingeniería

-Especialista ambiental

-Ingeniero responsable de contratos

b. Maquinaria y equipo en obra:

Equipos en área de trabajo:

-02 cisterna de agua

-04 excavadoras

-18 volquetes

-02 tractor sobre orugas

-01 Rodillo Liso

-01 Motoniveladora

-01 Cargador frontal

-01 Retroexcavadora

-Luminarias

Para traslado de personal:

-01 Bus de personal

-04 combis

-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

-02 track drill

-01 tracto de semitrailer

-02 compresoras

-02 rodillos lisos

-01 rodillo neumático

-02 excavadoras

-Parte de equipo de planta procesadora

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 14.10.2021.

-Jefe de supervisión (cambio de personal)

-Especialista en topografía, trazo, diseño vial y señalización

-Especialista en control de calidad

-Especialista en metrados y costos

-Especialista en seguridad de obra y salud ocupacional

-Especialista técnico en liberación de predios

-Especialista legal en liberación de predios

-Especialista en administración de contratos

-Especialista en Relaciones Comunitarias

-Responsable de Salud en el trabajo

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
 -02 combis
 -05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
 -Se recomienda firmar las asistencias diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:
 14-10-2021

Auditoria Fecha De Edición:
 18-10-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
 MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-10-2021

Actividades:

Asistencias 14.10

CDescripcion_____:

Se adjuntan registros de asistencias y control de Tº de contratista y supervision - 14.10.

Foto1:



Foto2:

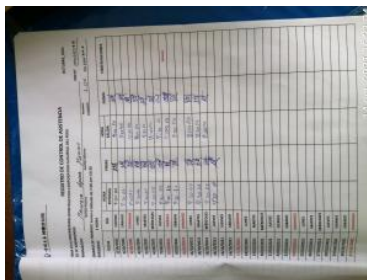


Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-10-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-10-2021

Actividades:

Control de emision de polvo

CDescripcion_____:

Actividades de regado de vía con cisterna de agua.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-10-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-10-2021

Actividades:

Levantamiento topográfico

CDescripcion_____:

Actividades de levantamiento topográfico de obras de arte entre los km 17+000 al km 20+000.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-10-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE
MARIN PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-10-2021

Actividades:

Corte Km 18+650

CDescripcion_____:

Actividades de corte y carguío en el km Km 18+650 con 01 excavadora y volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-10-2021

4
