



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                 |                            |                                     |  |   |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|---|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si | <b>Nro Informe:</b><br>064 | <b>Fecha Informe:</b><br>18-10-2021 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA | <b>Personal Encargado:</b><br>NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|---|

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:





Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



**Asunto:**

INFORME DIARIO N° 064-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

#### Conclusiones:

##### 1. CUADERNO DE OBRA:

-Se actualizó el cuaderno de obra hasta 13.10.2021.

-En el asiento N° 253, del Supervisor (11.10.21). El supervisor solicita el Calendario Acelerado al Contratista, según el art. 203 del RLCE "demoras injustificadas en la ejecución de la Obra"

-En el asiento N° 254, del Supervisor (13.10.21). El supervisor deja constancia que, con Oficio N° 2397-2021-MTC/20.9 de fecha 12.10.21, El Director de Obras de Provias Nacional autoriza el reemplazo del Jefe de Supervisión y acepta la participación del ing. Juan Miguel Mendoza Cruzado, quien ya se encuentra en oficina de Santa María, y acompaña en la visita a campo a la Comisión de Control Recurrente de la CGR.

-En el asiento N° 255, del Supervisor (13.10.21). El supervisor ha recorrido los frentes de trabajo y deja constancia que:

01.El contratista tiene los sgtes fretes:

Km 18+600 al km 18+740

Km 23+500 al km 23+770

Km 23+860 al km 23+920

Km 24+610 al km 24+720

Km 25+630 al km 25+700

02.Se han presentado 04 valorizaciones, desde inicio de obra tienen un avance de 0.35% y un atraso de 41.61% al 30 de Setiembre de 2021.

03.Recomienda al contratista avanzar la partid de Trazo y replanteo para ampliar frentes de trabajo y disminuir el atraso.

##### 2. OCURRENCIAS:

-La empresa contratista cuenta con 02 frentes de trabajo, para movimiento de tierras, con excavadoras y volquetes.

•Km 19+800 (trabajos de corte y carguío)

•Km 24+800 (Deslizamiento de material

-Regado de vía con 02 Cisternas de agua

-Trabajos de topografía

•Trazo y replanteo

•Levantamiento topográfico de obras de arte

##### 3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a.Del personal ofertado: Asistentes el día 18.10.2021.

-Ingeniero residente

-Ingeniero de producción (falta firma)

-Especialista de Suelos y pavimentos

-Especialista en geotecnia

-Jefe de oficina de ingeniería

-Jefe de oficina tecnica

-Ingeniero responsable de contratos

b.Maquinaria y equipo en obra:

Equipos en área de trabajo:

-02 cisterna de agua

-04 excavadoras

-18 volquetes

-02 tractor sobre orugas

-01 Rodillo Liso

-01 Motoniveladora

-01 Cargador frontal

-01 Retroexcavadora

-Luminarias

Para traslado de personal:

-01 Bus de personal

-04 combis

-07 camionetas



Equipos en campamento: (parados)

- 02 track drill
- 01 tracto de semitrailer
- 02 compresoras
- 02 rodillos lisos
- 01 rodillo neumático
- 01 excavadora
- Parte de equipo de planta procesadora

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 18.10.2021.

- Jefe de supervisión
- Especialista en topografía, trazo, diseño vial y señalización
- Especialista en suelos y pavimentos
- Especialista en control de calidad
- Especialista en estructuras
- Especialista en impacto ambiental
- Especialista en geología y geotecnia
- Especialista en hidrología e hidráulica
- Especialista legal en liberación de predios
- Especialista en arqueología
- Especialista en administración de contratos
- Especialista en Relaciones Comunitarias
- Responsable de Salud en el trabajo

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

- 02 combis
- 05 camionetas

**Recomendaciones:**

- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.
- Se recomienda firmar las asistencias diariamente.

**Auditoria Fecha De Creación:**

22-10-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

22-10-2021

## **PANEL FOTOGRAFICO**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-10-2021


**Actividades:**  
 Registro de Asistencias 18.10

**CDescripcion:**  
 Se adjuntan los registros de asistencia y temperatura del 18.10.


**Foto1:**



**Foto2:**

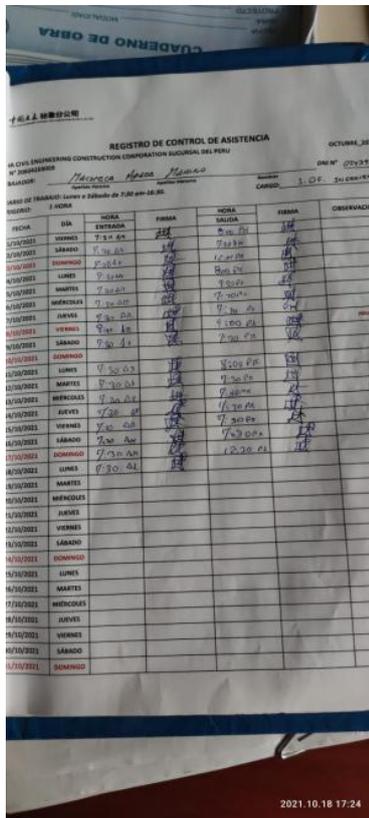

**Foto3:**

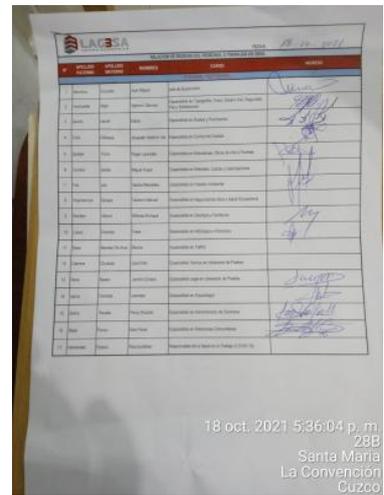

18 oct. 2021 5:36:04 p. m.  
 288  
 Santa María  
 La Convención  
 Cuzco

**Fecha Toma De Datos:**  
 22-10-2021
