



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	194- NAC M - ESC - DO PVN	05-11-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 194-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL VIERNES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE - TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL
CONSORCIO CONTRATISTA COSAPI-OHL

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL
RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 123+000 AL KM
126+000

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04

MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03

TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE

ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER,
02

CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX
MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a)PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 TÉCNICO DE COMPUTO

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b)OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Recomendaciones:

SUBSANAR LAS OBSERVACIONES QUE FORMULA LA SUPERVISION A LOS TRABAJOS FALTANTES EN EL MANTENIMIENTO.

Auditoria Fecha De Creación:

05-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

09-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 123+000 AL KM 124+000

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01 VOLQUETE, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

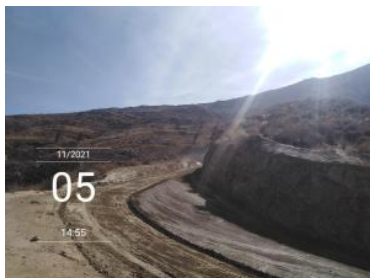
05-11-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 124+000 AL KM 125+000

CDescripcion_____:

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

05-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 124+000 AL KM 125+000

CDescripcion_____:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA DAR TRANSITABILIDAD DE LA VIA.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

05-11-2021

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO**Nivel:**

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-11-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO K 125+000 AL KM 126+000

CDescripcion_____:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA VIA.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

05-11-2021

4
