

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 208-NACM-ESC-DO PVN | Fecha Informe: 22-11-2021 | Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50 | Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME N° 208-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL LUNES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE - TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA COSAPI-OHL

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 122+000 AL KM 129+000

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04

MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03

TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE

ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER, 02

CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 TÉCNICO DE COMPUTO

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS



Recomendaciones:

AL CONSORCIO CONTRATISTA SE RECOMIENDA COMO PAARTE DEL MANTENIMIENTO DE LA VIA DEBE REALIZAR LA LIMPIEZA DE TODAS LAS ALCANTARILLAS (TMC Y MCA) YA QUE SE TIENE SERCANIA AL PERIODO DE LLUVIAS EN TODO EL TRAMO DE LA OBRA.

Auditoria Fecha De Creación:
21-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:
23-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

| | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Personal Encargado: | Nivel: | Fecha De Fotografia: |
| CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO | No Aplica | 22-11-2021 |

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAS KM 125+000AL KM 129+000

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-11-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-11-2021

Actividades:
UBICACION: TRAMO KM 125+000 AL KM 129+000

CDescripcion_____:
LIMPIEZA, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA.

2

Foto1:



Foto2:

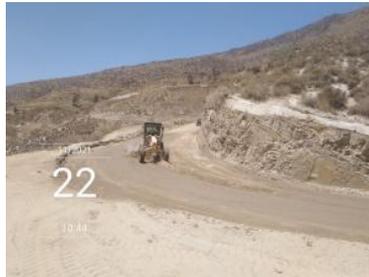


Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-11-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVAS KM 122+000 AL KM 125+000

CDescripcion_____:
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-11-2021
