

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	223-NACM - ESC - DO PVN	09-12-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME N° 223-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL JUEVES 09 DE DICIEMBRE DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE - TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA COSAPI-OHL

SE TRABAJO EL DIA 08 DE DICIEMBRE QUE ES FERIADO, Y SE TRASLADO ESTE FERIADO PARA EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 79+200 AL KM 81+120

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04

MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03

TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER, 02

CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 TÉCNICO DE COMPUTO

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

AL CONSORCIO CONTRATISTA SE RECOMIENDA COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO DE LA VIA DEBE REALIZAR LA LIMPIEZA DE TODAS LAS ALCANTARILLAS (TMC Y MCA) YA QUE SE TIENE CERCANIA AL PERIODO DE LLUVIAS EN TODO EL TRAMO DE LA OBRA.

Auditoria Fecha De Creación:

09-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

09-12-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 79+200 AL KM 80+200

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO

MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

09-12-2021

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 79+200 AL KM 80+200

CDescripcion :

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

09-12-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAS KM 80+200 AL KM 81+120

CDescripcion :

3

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA DAR TRANSITABILIDAD A LA VIA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

09-12-2021

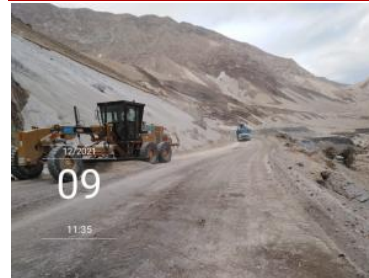
Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAS KM 80+200 AL KM 81+120

CDescripcion :

4

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA DAR TRANSITABILIDAD A LA VIA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)
