



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 004	Fecha Informe: 09-12-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa
--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME DIARIO N° 004-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

**Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

No se actualizo el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

La empresa contratista cuenta con 04 frentes de trabajo.

- Km 15+300 – trabajos de conformación de terraplén.
- Km 18+800 (trabajos de corte y carguío de material)
- KM 19+300 (trabajos de corte y carguío de material), este material se usa para terraplenes.
- KM 27+400 trabajos de conformación de terraplén.
- DME en el km 24+600.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

c. Del personal ofertado: Asistentes el día 09.12.2021.

Personal clave

- Ingeniero residente
- Ingeniero de producción (falta firma)
- Especialista de Obras de Arte y Drenaje (falta firma)
- Especialista en geotecnia
- Especialista en control de calidad

Personal No clave

- Jefe de oficina técnica
- Ingeniero de Trazo, Explanaciones y topografía
- Jefe de Oficina Técnica
- Especialista ambiental
- Ingeniero responsable de contratos

d. Maquinaria y equipo en obra:

Equipos en área de trabajo:

- 02 cisterna de agua
- 05 excavadoras
- 30 volquetes
- 02 tractor sobre orugas
- 02 Rodillo Liso
- 02 Motoniveladora
- 01 Cargador frontal
- 01 Retroexcavadora
- Luminarias

Para traslado de personal:

- 01 Bus de personal
- 04 combis
- 07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

- 02 track drill
- 01 tracto de semitrailer
- 02 compresoras
- 02 rodillos lisos
- 02 rodillo neumático
- 01 Planta procesadora

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 09.12.2021.

- Jefe de supervisión
- Especialista en topografía y trazo
- Especialista en Suelos y Pavimentos
- Especialista en control de calidad
- Especialista en estructuras, obras de arte y puentes
- Especialista en metrados y costos
- Especialista en impacto ambiental
- Especialista en seguridad de obra
- Especialista en geología y geotecnia
- Especialista en hidrología e hidráulica



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- Especialista técnico en liberación de predios
- Especialista legal en liberación de predios
- Especialista en Administración de contrato
- Especialista en Relaciones comunitarias
- Responsable de salud covid -19

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

- 02 combis
- 05 camionetas

Recomendaciones:

- Se recomienda que el personal de la empresa contratista firme sus registros de asistencia diariamente.
- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoría Fecha De Creación:

14-12-2021

Auditoría Fecha De Edición:

14-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografía:**

09-12-2021

Actividades:

Sector inestable Km 19+400

CDescripcion _____ :

2

Visita de campo del administrador de Contrato de Provias Nacionales, especialista del contratista y especialista de la supervisión, observado el sector inestable y lo que se indica en el expediente tecnico.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografía:**

09-12-2021

Actividades:

Visita de campo km 18+600 aprox.

CDescripcion _____ :

3

Se realiza la visita de campo al km 18+600 aprox, para observar el deslizamiento del material de talud, con el personal de Provias, Adm. Contrato, contratista y supervisión.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

09-12-2021

Actividades:


Solicitud de Reunión con el area de PACRI

CDescripcion _____ :

Se observaron las arreas liberadas para la zona de acceso en el km 0+900 en la Reunión entre el adm contrato y el área de PACRI, además indicaron que existen servicios que se estan encargando de las interferencias eléctricas y sanitarias. Y que se tiene gran porcentaje de avance en la liberación de predios.

4

Foto1:

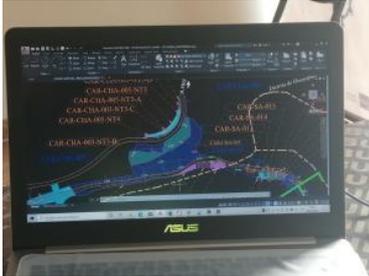

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

09-12-2021

Actividades:

Area propuesto para cantera

CDescripcion _____ :

Se observo un área propuesto para cantera (cumple con los ensayos de suelos) que se encuentra a 5 km de la salida de Huadquiña, poblado de Santa Teresa.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)
