



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 012	<b>Fecha Informe:</b> 18-12-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	<b>Personal Encargado:</b> NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>
<a href="#">Ver imagen completa</a>				

#### Asunto:

INFORME DIARIO N° 012-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

#### Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Conclusiones:

### 1. CUADERNO DE OBRA

No se actualizo el cuaderno de obra.

### 2. OCURRENCIAS:

La empresa contratista cuenta con 04 frentes de trabajo.

- Trabajos de corte de talud km 18+550, excedentes son depositados en DME 24600
- Trabajos de corte de talud km 19+2000, excedentes son depositados en DME 24600
- Conformación de Terraplén km15+300 con material del km 15+200.
- Conformación de Terraplén km 27+000 con material de acopio del km 24+600.
- Eliminación de derrumbe km 23+800 al DME 24+600
- DME en el km 24+600.

### 3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 18.12.2021.

Personal clave

- Ingeniero residente
- Especialista en suelos y pavimentos (falta firma)
- Ingeniero de producción (falta firma)
- Especialista de Obras de Arte y Drenaje (falta firma)
- Especialista en geotecnia
- Ingeniero de Control de calidad

Personal No clave

- Jefe de oficina técnica (falta firma)
- Ingeniero de Trazo, Explanaciones y topografía (falta firma)
- Jefe de Oficina Técnica
- Especialista ambiental (falta firma)
- Ingeniero responsable de contratos (falta firma)

b. Maquinaria y equipo en obra:

Equipos en área de trabajo:

- 04 excavadoras
- 30 volquetes
- 02 tractor sobre orugas
- 02 Rodillo Liso
- 02 Motoniveladora
- 01 Cargador frontal
- 01 Retroexcavadora
- Luminarias

Para traslado de personal:

- 02 Bus de personal
- 04 combis
- 07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

- 02 track drill
- 01 tracto de semitrailer
- 02 compresoras
- 02 rodillos lisos
- 02 rodillo neumático
- 01 Planta procesadora
- 02 cisterna de agua

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 18.12.2021.

- Jefe de supervisión
- Especialista en topografía y trazo
- Especialista en control de calidad
- Especialista en estructuras, obras de arte y puentes
- Especialista en metrados y costos
- Especialista en seguridad de obra



- Especialista en hidrología e hidráulica
- Especialista técnico en liberación de predios
- Especialista legal en liberación de predios
- Especialista en arqueología
- Especialista en Relaciones comunitarias

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

- 02 combis
- 05 camionetas

**Recomendaciones:**

- Se recomienda que el personal de la empresa contratista firme sus registros de asistencia diariamente.
- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

**Auditoria Fecha De Creación:**

20-12-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

20-12-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-12-2021

**Actividades:**

Asistencias 18.12

**CDescripcion :**


Se adjuntan los registros de asistencias y control de T<sup>0</sup> del contratista y supervisión 18.12.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

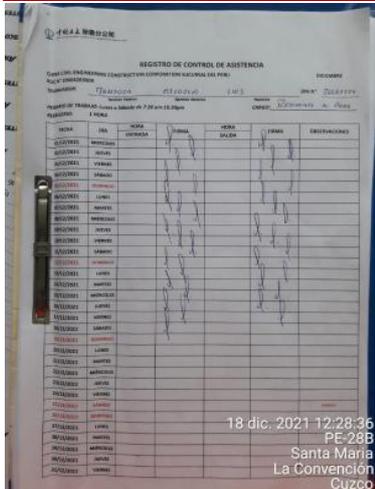

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)
