



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	015	22-12-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

**Foto Bitacora:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto Bitacora 2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto Bitacora 3:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto Bitacora 4:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto Bitacora 5:**



[Ver imagen completa](#)

**Asunto:**

INFORME DIARIO N° 015-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

**Foto Bitacora 6:**



[Ver imagen completa](#)

**Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

Se actualizo el cuaderno de obra.

-En el asiento N° 456 (21.12.21). El supervisor señala en el asunto la GFormulacion de adicional de nueva cantera Suriray km 23+000 de la via LD- acceso a 5 km, donde se señala que con Carta N° 225 -2021 –PVN – LAGESA/JS – RO (21.12.21)se ordena al contratista formular el Adicional de la nueva cantera Suriray, adjuntando el Informe N° 070 – 2021- LAGESA/TTDVS del especialista de Trazo quien elabore los planos , y el Informe N° 031 – 2021- LAGESA/ESP.-ESL sobre los ensayos de laboratorio a los agregados, que cumplen para concreto y asfalto, además se adjunta el Informe N° 024 – 2021- ERC- LAGESA/AMP/IS sobre la autorización de propietarios de la cantera quienes están de acuerdo con su explotación. EL POTENCIAL DE ESTA CANTERA ES DE 40000 M3.

Además, se le recuerda al contratista sobre la elaboración y presentación del Adicional de Cantera derrumbe, que se solicitó el 30.10.21.

-En el asiento N° 456 (21.12.21). El supervisor señala en el asunto la RD n° 2568 – 2021-MTC/20, y el supervisor deja constancia que según esta RD se le notifica al contratista via notarial la resolución de su contrato N° 059 – 2021-MTC/20.2, por lo cual se hace del conocimiento del contratista.

**2. OCURRENCIAS:**

La empresa contratista cuenta con 04 frentes de trabajo.

- Trabajos de corte de talud km 18+800, excedentes son depositados en DME 24600
- Conformación de terraplenes km 15+300 y km 27+000
- Acondicionamiento DME en el km 24+600.

**3. RECURSOS OFERTADOS**

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 22.12.2021.

Personal clave

- Especialista en suelos y pavimentos
- Especialista en geotecnia (falta firma)

b. Maquinaria y equipo en obra:

Equipos en área de trabajo:

- 04 excavadoras
- 30 volquetes
- 02 tractor sobre orugas
- 02 Rodillo Liso
- 02 Motoniveladora
- 01 Cargador frontal
- 01 Retroexcavadora
- Luminarias

Para traslado de personal:

- 02 Bus de personal
- 04 combis
- 07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

- 02 track drill
- 01 tracto de semitrailer
- 02 compresoras
- 02 rodillos lisos
- 02 rodillo neumático
- 01 Planta procesadora
- 02 cisterna de agua

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 22.12.2021.

- Jefe de supervisión
- Especialista en topografía y trazo
- Especialista en control de calidad



- Especialista en metrados y costos
- Especialista en seguridad de obra
- Especialista en hidrología e hidráulica
- Especialista en arqueología
- Especialista en Adm de contratos
- Especialista en Relaciones comunitarias

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

- 02 combis
- 05 camionetas

**Recomendaciones:**

- Se recomienda que el personal de la empresa contratista firme sus registros de asistencia diariamente.
- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

**Auditoria Fecha De Creación:**

22-12-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

29-12-2022

**PANEL FOTOGRAFICO**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografía:**

22-12-2021

**Actividades:**

DME 26+500

**CDescripcion :**

1 Acondicionamiento de material TOP SOIL en DME 26+500.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-12-2021

**Actividades:**

Terraplen km 27+000

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2 Verificación topográfica para liberación de siguiente capa en el terraplén del km 27+000

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-12-2021


**Actividades:**

Asistencias 22.12

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

3 Registro asistencias y control de T<sup>0</sup> de contratista y supervisión 22.12

**Foto1:**

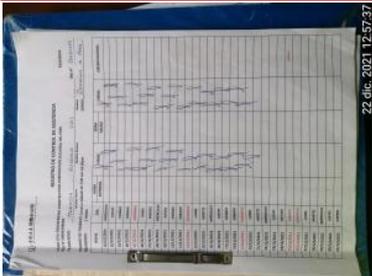

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-12-2021

**Actividades:**

Terraplén km 15+300

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

4 Conformación de terraplén km 15+300, con material del km 15+200.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-12-2021

**Actividades:**

Corte de talud km 21+000

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

5 S eobserva trabajos de corte de talud en km 21+000

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

22-12-2021

**Actividades:**


Levantamiento de observaciones a informe de faja marginal km 24+600

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

La supervisión presento el Levantamiento de observaciones a la Modificación de faja Marginal del km 24+600 a la Municipalidad de Santa Teresa.


6

**Foto1:**




[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)
