

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	007-2022 - NAC M - ESC -DO PVN - MTC	10-01-2022	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 007-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL LUNES 10 DE ENERO DEL 2022

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA COSAPI - OHL

Foto Bitacora 6:[Ver imagen completa](#)

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA

RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 137+000 AL KM 140+000

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN

CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR

FRONTAL, 01 VOLQUETE.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPOGRAFOS

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

SE ESTA PRODUCIENDO LAS PRIMERAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DE BAJA INTENSIDAD EN LAS PARTES ALTAS DEL TRAMO FINAL SECTOR PUQUINA.

Auditoria Fecha De Creación:

10-01-2022

Auditoria Fecha De Edición:

11-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

10-01-2022

Actividades:

UBICACION : TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 139+000 AL KM 140+000

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

10-01-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 138+000 AL KM 139+000

CDescripcion :

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

10-01-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 137+000 AL KM 138+000

CDescripcion :

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VIA.


3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

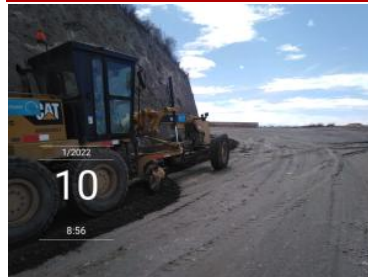

[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)
