



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	009-2022 - NAC M - ESC - DO PVN - MTC	12-01-2022	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa				

Asunto:

INFORME N° 009-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC
REPORTE DEL MIERCOLES 12 DE ENERO DEL 2022
OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE
TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA COSAPI - OHL
SE TIENE PRESENCIA DE LLUVIAS DE POCA INTENSIDAD EN TODA LA OBRA.

Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 132+000 AL KM 134+000

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPOGRAFOS

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

SE ESTAN PRODUCIENDO DESPRENDIMIENTO DE PIEDRAS Y TIERRA EN TODA LA OBRA, ESTO A CAUSA DE LAS LLUVIAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA INTENSIFICAR LA LIMPIEZA DE LA PLATAFORMA EN TODO EL TRAMO.

Auditoria Fecha De Creación:

12-01-2022

Auditoria Fecha De Edición:

13-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

12-01-2022

Actividades:


UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 132+000 AL KM 133+000

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

1

Foto1:

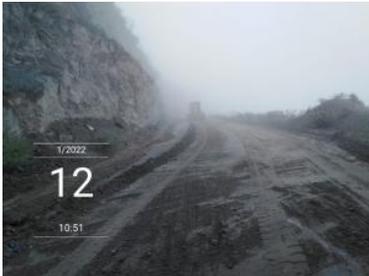

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

12-01-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 132+000 AL KM 133+000

CDescripcion _____ :

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-01-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAS KM 133+000 AL KM 134+000

CDescripcion _____ :

3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VIA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-01-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAS KM 85+100 AL KM 64+000

CDescripcion _____ :

4 SE TIENE DESPRENDIMIENTO DE PIEDRA Y TIERRA EN DIFERENTES TRAMOS POR ACCION DE LAS LLUVIAS.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)
