



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	012-2022 - NAC M - ESC -DO PVN - MTC	15-01-2022	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 012-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL SABADO 15 DE ENERO DEL 2022

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA COSAPI - OHL

SE TIENE PRESENCIA DE LLUVIAS DE POCA INTENSIDAD (GARUAS).

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA

RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 125+000 AL KM 126+000

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPOGRAFOS

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA REALIZAR LA LIMPIEZA EN ALCANTARILLAS DE TODA LA OBRA, PORQUE EN LO POSTERIOR SE PRESENTARAN PRECIPITACIONES PLUVIALES DE MAYOR INTENSIDAD.

Auditoria Fecha De Creación:

16-01-2022

Auditoria Fecha De Edición:

17-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

15-01-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 125+000 AL KM 126+000

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

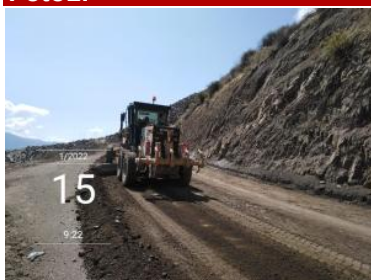
15-01-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PPROGRESIVAS KM 125+000 AL KM 126+000

CDescripcion :

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)
