



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	030-2022 - NAC M - ESC -DO PVN - MTC	05-02-2022	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
<a href="#">Ver imagen completa</a>				

#### Asunto:

INFORME N° 030-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL SABADO 05 DE FEBRERO DEL 2022

OBRA ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

NO SE TIENE PRECENCIA DE LLUVIAS EN TODO EL TRAMO DE LA OBRA

#### Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 106+500 AL KM 109+500

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPOGRAFOS

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

### Recomendaciones:

SE VERIFICO EN DIFERENTES PROGRESIVAS QUE SE TIENE DESPRENDIMIENTO DE PIEDRAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA REALIZAR LA LIMPIEZA PERMANENTE EN TODO EL TRAMO DE LA OBRA,

**Auditoria Fecha De Creación:**

07-02-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

09-02-2022

### PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

05-02-2022

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 106+500 AL KM 107+500

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
 MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01  
 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO  
 BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

05-02-2022

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO KM 107+500 AL KM 108+500

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA.

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

05-02-2022

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVAS KM 108+500 AL KM 109+500

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

3 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIA.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

05-02-2022


**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVAS KM 108+500 AL KM 109+500

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

4 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VIA.

**Foto1:**

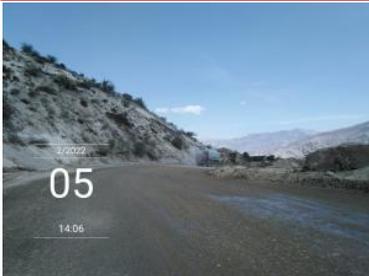


[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

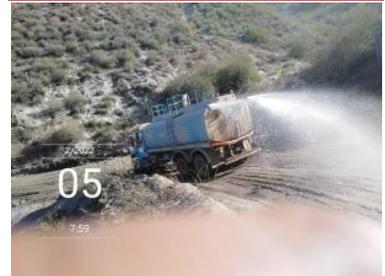

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

05-02-2022

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 113 PUENTE AMARILLO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

SE VERIFICO EL ESTADO SITUACIONAL DEL PUENTE.  
NO PRESENTA SOCAVACION, EN TERMINOS GENERALES EL PUENTE SE  
ENCUENTRA OPERATIVO.

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)
