



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	045-2022 - NAC M - ESC -DO PVN - MTC	23-02-2022	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 045-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MIERCOLES 23 DE FEBRERO DEL 2022

OBRA ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

SE TIENE PRECENCIA DE LLUVIAS DE POCA INTENSIDAD Y CORTA DURACION EN EL SECTOR PUQUINA.

SE TIENE LA VISITA DE UNA COMISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA VERIFICACION INSPECCION FISICA DE APROBACION DE LA PAO 014 - CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE JUNTAS EN MUROS Y BADENES (EN TOTAL 344) A LO LARGO DE TODALA OBRA.

INTEGRANTES:

COMISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA:
ING. GUSTAVO SULCA ROCA
ING. LUIS LAZARTE MARTINES

JEFE DE SUPERVISION :
ING. ANGEL JAVIER BALANDRA ARIAS

DEL CONTRATISTA:
ING. WILLAM MENDOZA CACERES (ESP. EN TOPOGRAFIA)

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD.
DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN
CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 VOLQUETE.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

24-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

26-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-02-2022

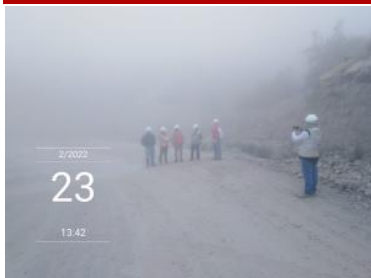
Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 153+227

CDescripcion :

VERIFICACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA PRESTACION ADICIONAL N° 014

INTERVIENE JEFE DE SUPERVISION, INTEGRANTES DE LA COMISION DE LA CGR Y ESP. TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-02-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 145+588

SE CONTINUA MIDIENDO LAS JUNTAS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

CDescripcion :

2

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO

MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-02-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 139+783

CDescripcion :

VERIFICACION DE LAS JUNTAS DE DILATACION EN MUROS CONFORME A LA PRESTACION ADICIONAL N° 14 QUE CORRESPONDE AL CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS JUNTAS EN MUROS DE CONTENCIÓN Y BADENES.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)
