

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:		Personal Encargado:	
Si	020	25-02-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA		NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:	

[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)[Ver imagen completa](#)**Asunto:**

INFORME DIARIO N° 020-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU- ITEM A / NKMP



Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA

No se actualizó el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

-La empresa contratista realiza actividades de:

- Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.
- Corte de talud
- Trabajos de acarreo de material al DME.
- Limpieza de derrumbes y deslizamientos a lo largo de la vía.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 25.02.2022

1. Ingeniero de producción (falta firma)
2. Especialista de suelos y pavimento
3. Especialista de obras de arte y drenaje
4. Especialista en geotecnia (falta firma)
5. Jefe de oficina de ingeniería (falta firma)
6. Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía (falta firma)
7. Jefe de oficina técnica (falta firma)
8. Responsable de contrato (falta firma)

b. Equipos en área de trabajo:

- Excavadoras
- Volquetes
- Tractores sobre orugas
- Rodillos Lisos
- Motoniveladoras
- Track drill
- Luminarias

Para traslado de personal:

- 02 Bus de personal
- 04 combis
- 07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

- 01 track drill
- 02 compresoras
- 01 Planta chancadora
- 01 cisterna de agua
- 01 cisterna de combustible
- 07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 25.02.2022

1. Especialista ambiental
2. Especialista en geología y geotecnia
3. Especialista en seguridad de obra
4. Especialista Legal en Liberación de Predios
5. Especialista en arqueología
6. Especialista en administración de contrato
7. Responsable de salud covid -19

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

- 02 combis
- 05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de asistencia.

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Auditoria Fecha De Creación:**

01-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

01-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

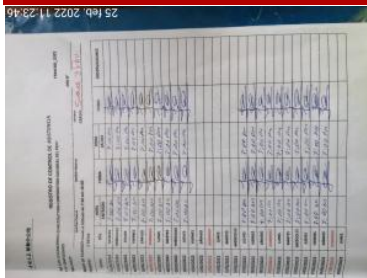
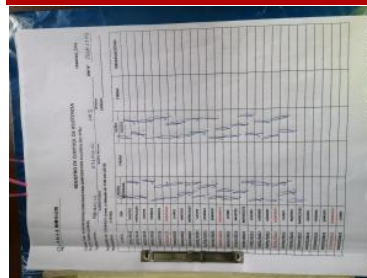
25-02-2022

Actividades:

Asistencias 25.02.22

CDescripcion :

1 registro de asistencias personal contratista y supervisión 25.02

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2022

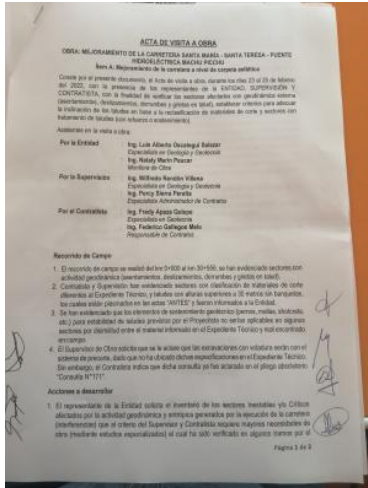
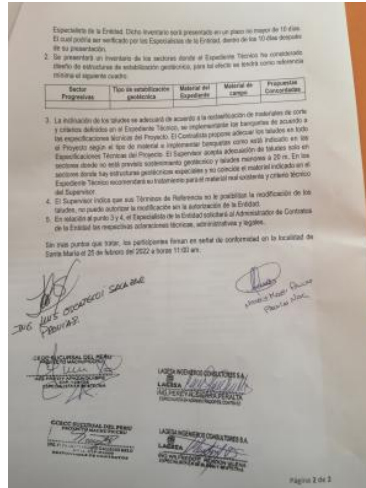
Actividades:

Acta de visita técnica

CDescripcion :

Se firmo el acta técnica de visita a obra con los especialistas de geología de la entidad, supervisión y contratista, donde se acordaron los procedimientos para los sectores observados (sectores críticos e inestables)

2

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)
