



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 015 | Fecha Informe: 21-02-2022 | Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS | Personal Encargado: MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B | | |
| Foto Bitacora:  Ver imagen completa | Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa | Foto Bitacora 3: Ver imagen completa | Foto Bitacora 4: Ver imagen completa | Foto Bitacora 6: Ver imagen completa | Foto Bitacora 5: Ver imagen completa | |

Asunto:

INFORME DIARIO N° 015-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP



Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA

Se actualizo el cuaderno de obra.

-Asiento N° 286 del Contratista (18.02.22).

El contratista deja constancia de la afectación de la ruta crítica por no poder ejecutar la partida Acero de refuerzo F`y =4200 kg/cm2 par drenaje que debió iniciar el 12.02.22 debido a la falta de entrega de permisos ambientales, por lo que se reserva el derecho de solicitar ampliación de plazo.

-Asiento N° 287 del Contratista (18.02.22).

El contratista deja constancia que el día 18.02 se presento un incidente d etrabajo a las 11.37 horas en el frente de Portal de la galería de emergencia por lo que la supervisión paralizo las labores en dicho frente y solicito implementar recomendaciones indicadas con Carta N° 112-2022-S.SST(P) (18.02.22), asimismo se presento un Flash reporte con Carta N° CCC-PERU-2022-RO-0065 (18.02.22)

-Asiento N° 288 de Supervisión (21.02.22).

El supervisor indica respecto a los asientos:

(i)Asiento N° 286, que el contratista debe presentar la justificación documentada para su evaluación.

(ii)Asiento N° 287, el contratista presento información preliminar quedando pendiente documentación de investigación; asimismo el supervisor sugiere que el enfoque de seguridad tiene que estar presente en:

1.Seguridad antes del incidente

2.Seguridad después del incidente, que corresponde proponer al contratista

La paralización en el frente de trabajo donde ocurrió el incidente es responsabilidad del contratista y la continuación de actividades esta sujeta a la revisión de protocolos para su reinicio. Además, se recuerda al contratista que las demás partidas siguen en desarrollo según lo previsto en el expediente técnico.

-Asiento N° 289 de Supervisión (22.02.22).

El supervisor solicita los planos de Planta industrial Santa Rosa al contratista, ya que se observa que la nueva difiere del expediente técnico, por lo que al respecto el contratista debió tramitar un ITS sobre las áreas auxiliares que está usando a la brevedad.

2. OCURRENCIAS

-Adecuación de Planta industrial (montaje de planta de concreto)

-Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Santa Rosa.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 21.02.2022

Personal clave:

1. Ingeniero residente

2. Ingeniero de producción

3. Especialista de suelos y pavimentos

4. Especialista de obras de arte y drenaje

5. Especialista en geología

6. Jefe de oficina de ingeniería

7. Especialista ambiental

8. Jefe de oficina técnica

9. Responsable de contrato

b. Maquinaria y equipo:

-02 jumbos

-01 motoniveladora

-01 cargador frontal

-01 mezcladora

-01 rodillo

-02 volquetes

-01 camión grúa

-03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 21.02.2022

1. Jefe de supervisión
2. Especialista de control de calidad
3. Especialista en trazo, topografía y diseño vial
4. Especialista en estructuras y obras de arte
5. Especialista en seguridad de obra
6. Especialista en Geología y Geotecnia
7. Especialista en Hidrología
8. Especialista técnico de liberación de predios
9. Especialista legal de liberación de predios
10. Especialista en arqueología
11. Especialista en instalaciones de túneles
12. Especialista en administración de contratos

b. Vehículos para transporte de personal:

-04 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda el registro diario de asistencias de personal contractual propuesto.

Auditoría Fecha De Creación:

01-03-2022

Auditoría Fecha De Edición:

09-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras


Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
21-02-2022


Actividades:
Asistencias 21.02

CDescripcion :
Registro de asistencias 21.02

1

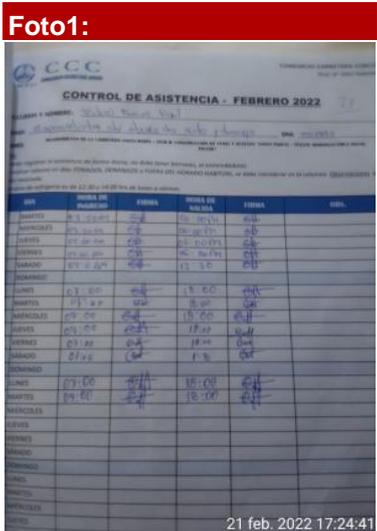

[Ver imagen completa](#)

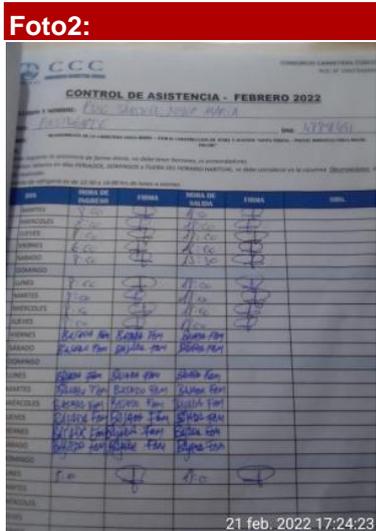

[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)
