



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 029	Fecha Informe: 08-03-2022	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa				

Asunto:

INFORME DIARIO N° 029-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU- ITEM A / NKMP

**Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

No se actualizo el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

-La empresa contratista realiza actividades de:

•Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.

-Cortes de talud, cuyo material es trasladado a los DME'S del km km 15+300, km 21+180 y km 24+600.

?Km 13+700 al km 13+800

?Km 14+300 al 14400

?Km 23+800 al km 23+900

•Terraplen

?Km 26+100

?Km 27+000

•Limpieza de derrumbes km 19+000

•Se realizó un recorrido con especialistas de topografía y obras de artes de contratista y supervisión para verificar zonas inestables, con erosión y posible cambio de eje, para su planteamiento de solución. del km 9+000 al km 18+000.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 08.03.2022

1. Ingeniero residente

2. Ingeniero de producción

3. Especialista de suelos y pavimento

4. Especialista de obras de arte y drenaje

5. Especialista en geotecnia

6. Ingeniero de control de calidad

7. Jefe de oficina de ingeniería

8. Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía

9. Jefe de oficina técnica

10. Especialista ambiental

11. Responsable de contrato

b. Equipos en área de trabajo:

-Excavadoras

-Volquetes

-Tractores sobre orugas

-Rodillos Lisos

-Motoniveladoras

-Track drill

-Luminarias

Para traslado de personal:

-02 Bus de personal

-04 combis

-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

-01 track drill

-02 compresoras

-01 Planta chancadora

-01 cisterna de agua

-01 cisterna de combustible

-07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 08.03.2022

1. Jefe de supervisión

2. Especialista de topografía y trazo

3. Especialista de control de calidad

4. Especialista en estructuras y obras de arte

5. Especialista de metrados, costos y valorizaciones



- 6. Especialista en seguridad de obra
- 7. Especialista en geología y geotecnia
- 8. Especialista técnico de liberación de predios
- 9. Especialista en administración de contrato
- 10. Especialista en relaciones comunitarias

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
 -02 combis
 -05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda actualizar el cuaderno de obra.

Auditoria Fecha De Creación:

13-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

13-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-03-2022

Actividades:

Corte de talud km 18+000

CDescripcion :

Corte y carguio de material en km 18+000.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

08-03-2022

Actividades:

Corte de talud km 23+400

CDescripcion _____ :

Corte de talud y carguo de material en km 23+400 aprox

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

08-03-2022

Actividades:

Terraplenes

CDescripcion _____ :

3 Extendido y compactado de terraplen en km 26+100 y km 27+000

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

08-03-2022

Actividades:

Evaluacion en campo Topografia y Obras de arte

CDescripcion _____ :

4 Recorrido del tramo km 9+000 al km 18+000 entre contratista y supervision para verificacion de zonas de erosion, zonas inestables y necesidad de construccion estructuras para mitigacion de efectos de estas fallas.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-03-2022

Actividades:

Asistencias 08.03

CDescripcion :

Registro de asistencias 08.03


Foto1:

Nº	Apellido y Nombre	Cargo	Firma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

8 mar. 2022 4:39:00 p. m.
Santa Maria
La Convencion
Cuzco


[Ver imagen completa](#)

Foto2:

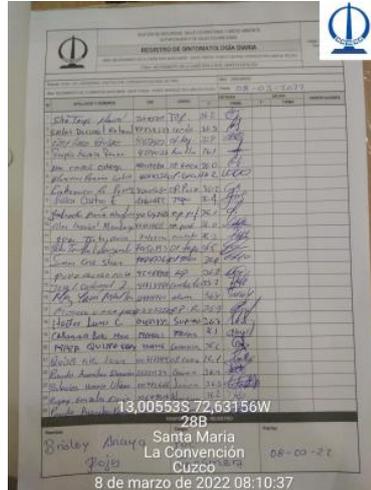

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

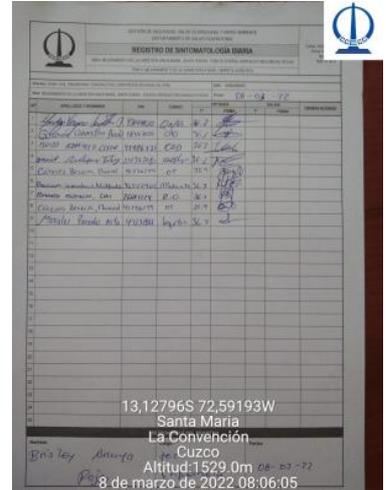

[Ver imagen completa](#)

5
