



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	057-2022- - NAC M - ESC -DO PVN - MTC	30 - 03 - 2022	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME N° 057-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MIERCOLES 30 DE MARZO DEL 2022
 ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE
 TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 127+500 AL KM 130+500
 DEL CONTRATISTA :
 A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
 B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
 02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
 MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.
 LA SUPERVISIÓN:
 a)PERSONAL CLAVE:
 01 JEFE DE SUPERVISIÓN
 02 TOPOGRAFOS
 01 SECRETARIA
 01 CONDUCTOR
 b)OTROS:
 01 CAMIONETA PICK UP 4X4
 01 OFICINA
 01 EQUIPOS DE COMPUTO
 01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

30-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

01-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

30-03-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 127+500 AL KM 128+500

CDescripcion

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-03-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 128+500 AL KM 129+500

CDescripcion _____ :

2

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA.

Foto1:




[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

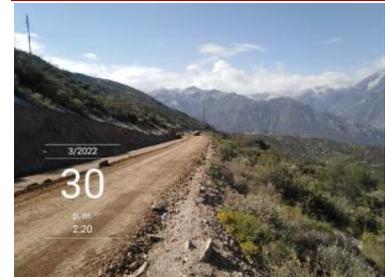

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-03-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 129+500 AL KM 130+500

CDescripcion _____ :

3

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)
