



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 61	Fecha Informe: 02 - 04 - 2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 02/04/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+430, 0+700, 0+850, 1+250, 2+860, 3+400, 3+700, 5+800 y 7+800, OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+803, 7+690, 8+660 y 10+200. PUENTE LA ACHIRANA, PERFORACION DE PILOTES KM. 0+200

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO Y TRAMITES DEL NUEVO DME.

Auditoria Fecha De Creación: 02-04-2022	Auditoria Fecha De Edición: 02-04-2022	
---	--	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

02-04-2022

Actividades:

PERFORACION DE PILOTE IZQUIERDO KM. 0+200

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES
01 GRUA
01 EXCAVADORA
08 PERSONAL

1

Foto1:




[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

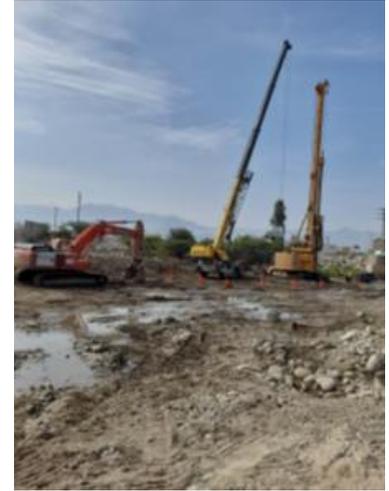

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

02-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 2+860

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

03 VOLQUETES

02 PERSONAL

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

02-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+400

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

02-04-2022

Actividades:

CANAL REVESTIDO KM. 10+200

CDescripcion _____ :

PERSONAL 10

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)
