

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	75	20 - 04 - 2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 20/04/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 2+700, 3+350, 4+300 Y 6+640.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 0+557, 5+570, 7+280 Y 8+850.
EXCAVACION DE PILOTES EN EL KM. 0+200.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO, NUEVO DME.

Auditoria Fecha De Creación:

20-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

21-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

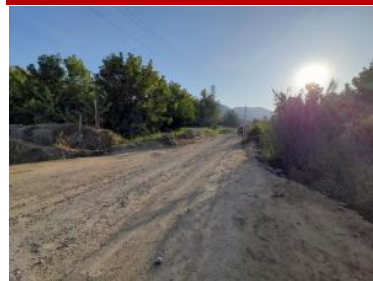
20-04-2022

Actividades:

RECORRIDO AL TRAMO KM. 12+260.

CDescripcion :

1

SUPERVISOR - CONTRATISTA - REPRESENTANTE DE DDV. ING. ENRIQUE DIAZ.
ALTERNATIVA DE SOLUCION DE CANALES DE REGADIO.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

20-04-2022

Actividades:

PASE DE RIEGO KM. 7+280.

CDescripcion :

2

PERSONAL 04

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

20-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 6+640.

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 TRACTOR
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

20-04-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+350.

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)
