



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora:                  | Nro Informe:                        | Fecha Informe:                      | Nombre De La Obra:                                              | Personal Encargado:                 |                                     |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Si                                  | 0092                                | 06 -<br>05 -<br>2022                | Carretera Oyon - Ambo,<br>Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco | BORIS WALTER AYLLÓN<br>CARCELÉN     |                                     |  |
| Foto Bitacora:                      | Foto Bitacora 2:                    | Foto Bitacora 3:                    | Foto Bitacora 4:                                                | Foto Bitacora 5:                    | Foto Bitacora 6:                    |  |
| <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a>                             | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> |  |

#### Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0092  
CONTRATO DE OBRA: No. 073-2018-MTC/ 20 de fecha 17/07/2018  
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL AMBO ( CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA SUCURSAL DEL PERU, GRINOR S.A. SUCURSAL DEL PERU Y J E CONSTRUCCIONES GENERALES S.A)  
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I: OYON - DESVIO CERRO DE PASCO- VIA PRINCIPAL KM. 134+977.92 AL KM. 181+000 Y RAMAL KM. 136+780 A KM. 139+698.19  
TRAMO 1 Vía principal : Progresiva km. 134+977.92 al Km. 181+000 ; Ramal: Progresiva Km.136+780 a Km. 139+698.19  
FINALIZACION DE LA SUSPENSIÓN DE OBRA EN CAMPO A PARTIR DEL DIA 22-03-2022 , LA CONTRATISTA HABIA SOLICITADO LA SUSPENSIÓN DE OBRA MEDIANTE ADENDA No. 8 Y NO HA SIDO ACEPTADO POR PROVIAS NACIONAL., EL CUAL SE LE DA RESPUESTA AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO No. 620 -2022-MTC/20.9 DE FECHA 23-03-2022. ( DONDE SE LE SOLICITA EL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA OBRA) EL PARO DE TRANSPORTE A AFECTADO EL TOTAL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA OBRA,  
VISITA DE MONITOREO AL TRAMO 1 DESDE POBLADO DE OYON HASTA EL KM. 141+000 Y RAMAL  
VISITA DE VERIFICACIÓN DE PARTIDAS EJECUTADAS HASTA EL MES DE ABRIL 2022 VALORIZADAS EN LA VALORIZACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL CONTRATISTA  
VISITA DE CONSTATAION DE ACTIVIDADES DE MAYORES METRADOS EJECUTADOS No. 4 ( RAMAL)

**Conclusiones:**

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy no se logro acceso al cuaderno de obra.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación No. 12 de 111 días calendario aprobado según Resolución Directoral No. 0789-2020-MTC/ 20 de fecha 03-07-2020 ; Ampliación de plazo No. 18 por 36 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 2106-2020-MTC/ 20 de fecha 29-10-2020; Ampliación de plazo No. 23 por 24 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 048-2021-MTC/ 20 de fecha 27-01-2021: Ampliación de plazo No. 27 por 195 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 0296-2021-MTC/ 20 de fecha 05-03-2021; Ampliación de plazo No. 32 por 83 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 1917-2021-MTC/ 20 de fecha 20-09-2021; Ampliación de plazo No. 35 por 81 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 2511-2021-MTC/ 20 de fecha 16-12-2021; Se ha aprobado Suspensión No. 1 desde el 30-03-2021 al 30-04-2021 mediante Adendas No. 3 y No. 5 y una nueva suspensión de plazo No. 2 del 22-12-2021 hasta el 21-03-2022 mediante Adenda No. 7 por 90 días, quedando la fecha de terminación del contrato hasta el día 12-06-2022

2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado presupuestos adicionales No. 1 No 2 ,No. 3, No. 4 , No 5 y No. 6 con 5 deductivos vinculantes. Siendo los siguientes:

ADICIONAL No. 1 : Muros de contención Km. 135+500,42 al Km. 175+187.696.

ADICIONAL No. 2 : Solución planteada a Afloramiento de Agua en talud de Corte.

ADICIONAL No. 3 : Muros de Contención, Losas y ,Muros paraguas en el Km. 137+452.50 al KM. 137+520; Km. 140+235 al km 140+275 , Km. 140+633.30 al Km. 140+663.31, KM. 141+773.97 al Km. 141+794.03, KM. 144+540 al Km. 144+660

ADICIONAL No. 4 : MUROS DE CONTENCION VIA RAMAL Km 137+345, KM. 137+375, KM. 137+695 al Km. 137+715, Km. 137+745 al Km. 137+760

ADICIONAL No. 5 : MUROS DE CONTENCION, DRENES DE PERFORACION HORIZONTAL, SUB DRENES, REUBICACION DE ALCANTARILLA, INTERSECCION RAMAL CON LA VIA PRINCIPAL PANTALLA DE MICROPILOTES CON ANCLAJES ACTIVOS PERMANENTES Y SISTEMA DE MURO ANCLADO TIPO PARAGUAS.

ADICIONAL No.6:, PUNTOS CRITICOS POR DESLIZAMIENTO ( RAMAL ) km. 138+100 a Km. 138+180 aprobado según resolución directoral NO. 2333 de fecha 22-11 2021

3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a tramitado ante la Entidad, presupuestos de mayores metrados donde actualmente se ha autorizado ; S/ 4,512,617.13 incluyendo IGV

4) DEDUCTIVOS : Se tiene información de un deductivo No vinculante No. 6 por S/. 3.664.658,80 aprobado según Resolución Directoral No. 2650- 2021-MTC/ 20 de fecha 23/12/2021 (REDUCCION DE METAS DEL PEAJE UCCHUCCHACUA) , Además se ha tramitado un Deductivo No. 7 por SECTORES CRITICOS en las progresivas KM. 135+470 al Km. 136+340 (870 metros) el cual se espera la aprobación del presupuesto deductivo.

5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: No se tiene información

6) MANTENIMIENTO VIAL: Se realiza un mantenimiento en toda la vía, principalmente limpieza, de alcantarillas tapadas

7) RECURSOS OFERTADOS:

DEL CONTRATISTA

a) PERSONAL: personal 25 obreros, 5 capataces, 1 topógrafo, 3 auxiliares de topografía, 1 ing. asistente de producción, Ing. de SOMA , , ing. de Control de calidad. Se incorporan poco a poco el personal técnico y obrero al reinicio de actividades. 1 ing. de producción, 1 especialista en administración de contrato 1 especialista de suelos, 1 especialista ambiental, 1 especialista de metrados y valorizaciones, 1 ing. de trazo y topografía, 4 técnicos de la contratista.

b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están en los lados del tramo 1 y están activas, 2 motoniveladoras, 3 retroexcavadoras, 2 excavadora de oruga , 1 excavadora de ruedas neumáticas, 1 mini cargador, una mini compactadora de doble rodillo , 1 tractor d8 de oruga, 2 compactadora de rodillo, 1 camión cisterna y 14 volquetes. hay dos PAVIMENTADORAS en la vía, sin actividad, 1 cargador frontal , hoy se incorporo una excavadora de oruga con accesorio de demolición color rojo.

DEL SUPERVISOR

a) PERSONAL : 1 ing. control de calidad, ing. Seguridad, ing. de trazo y topografía. 1 ing. de hidrología y obras de drenaje, 1 costos y valorizaciones, , 1 ing. de suelos y pavimentos, 1 ing. ambiental, 1 técnico de liberación de predios, 1 ing. de estructuras y obras de arte, 12 personal técnico y 8 administrativo trabajando en la zona.

MAQUINARIA Y EQUIPO: Actualmente solo tienen 5 vehículos 4x4 activos y equipos de oficina. 2 estación total y 2 nivel topográfico ( sin utilizar) .8) INCIDENTE: No se tiene información de incidentes

9) PACRI: De acuerdo a lo informado por la UGDV ( ex PACRI) todos los predios y viviendas por el proyecto se encuentran liberados con sus respectivas actas de compromiso de trato directo firmados, los cuales ya han sido indemnizados. A la fecha se han Identificado 33 nuevas afectaciones , generados por el replanteo y proceso constructivo , también hay interferencias

**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

como pases de aducción de agua, zonas donde los propietarios no permiten la ejecución de la vía en su sector. En la vía Ramal existe interferencia de líneas de agua en aproximadamente un kilómetro de longitud, donde se imposibilita la ejecución de actividades

10) ARQUEOLOGIA : Existe un muro prehispánico y un camino prehispánico que según la Contratista está impidiendo la realización de trabajos de conformación del talud superior y la reposición del canal de riego comunal el cual se desconoce si estos sectores están liberados

11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es despejado y soleado en el sector 1 y hoy está soleado también en el sector 2. La obra ya no está en suspensión de acuerdo a OFICIO No. 620 -2022- MTC/20.9 DE FECHA 23- 03-2022. ( DONDE SE LE SOLICITO EL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA OBRA) . Hasta ahora con la valorización del mes de DICIEMBRE 2021 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la Supervisión, Continúa en condición de ATRASADA. Los días de paro de transporte ha ocasionado atrasos en la incorporación de los recursos de la Contratista y la Supervisión. La contratista ha presentado valorización mes Abril 2022 ( en revisión de la Supervisión)

**Recomendaciones:**

Se recomienda a la Contratista incrementar la movilización y reactivación de maquinarias y equipos de acuerdo a lo indicado en el OFICIO No. 620 DEL 23-03.2022 puesto que las condiciones climáticas durante esta semana han sido muy favorables ( soleado todo el día en todo el tramo I

Se recomienda a la Contratista realizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en reunión con la comunidad de Oyón y con los compromisos de pagos con terceros.

Se recomienda a la Supervisión la inmediata actualización de la calibración de sus equipos de laboratorio, movilización y utilización de equipos en obra.

Se recomienda la realización del Adicional para obra de zanja de drenaje en DME No. 4 y adecuación de descarga de alcantarilla en el Km. 153+111,10, el cual está a cargo de PROVIAS NACIONAL - dirección de Obras.

Se requiere de manera urgente solucionar el problema de afectación de hacienda Otuto (caso Familia Mugurusa) el cual está impidiendo la posibilidad de ejecución de las PRESTACIONES ADICIONALES No. 04 Y 05, ejecución de partidas contractuales en aproximadamente 3 km de vía del tramo I.

Es importante también la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que se corre riesgo todos los días al realizar los recorridos en el tramo I, El no tener EPPs en buenas condiciones podría ocasionar incidentes y accidentes laborales y enfermedades como gripes, covid-19, etc

El día 12-05-2022 se vence el contrato de alquiler de camioneta es importante que se realice el requerimiento de este servicio, para no quedar sin camioneta, es este tiempo que se incrementan las actividades en obra

**Auditoría Fecha De Creación:**

06-05-2022

**Auditoría Fecha De Edición:**

07-05-2022

**PANEL FOTOGRAFICO****Panel Fotográfico**

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**


06-05-2022

**Actividades:**

POBLADO DE OYON

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION :  
EN BUSCA DEL CUADERNO DE OBRA.**CDescripcion**

En el poblado de Oyón, Se realiza visita de seguimiento y monitoreo a las oficinas de la supervisión, donde se busco el cuaderno de obra, y verificación de recursos. Se verifica los recursos utilizados

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

06-05-2022

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 134+986

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL INICIO DEL TRAMO I: ENTRADA DE OYON

**CDescripcion**

:

En la progresiva Km. 134+986 se realiza la visita de seguimiento y monitoreo en el inicio del tramo I, de la vía principal, no se realiza actividades en esta zona, el clima en la zona es completamente soleado en todo el tramo I en horas de la mañana.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

06-05-2022

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 137+814 A KM. 137+865

VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES VALORIZADAS MES ABRIL -  
CONTRATISTA: CANAL DE CONCRETO CONSTRUIDO

610.H CONCRETO CLASE H ( F'C= 100 KG/CM2)

610.E CONCRETO CLASE E ( F'C= 175 KG/CM2)

612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

615.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2

655.I JUNTA DE CONSTRUCCION WATER STOP

**CDescripcion :**

En la progresiva Km. 137+814 a Km. 137+865 se realiza visita de verificación de las actividades incluidas de la valorización No. 37 ( MES DE ABRIL 2022) donde esta actividades se realizaron despues del 15-12-2021 y luego se suspendió actividades hasta el 21-03-2022. Se realiza visita insitu y se verifica el canal construido y se incluye en la Valorización No. 37 del Contratista. Se verifico estas actividades realizadas con la presencia de la Supervisión y Contratista.

3

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

06-05-2022

**Actividades:**

PROGRESIVAS KM. 139+600 AL KM. 139+660 ( PROGRESIVA KM.139+600)  
VISITA DE CONSTATAACION DE LABORES DE MAYORES METRADOS: MAYOR  
METRADO No. 4 KM. 136+780 AL KM. 139+697.05 DE LA VIA RAMAL:

**CDescripcion :**

En la Progresiva Km. 139+600 se realiza la visita de constatación in situ de trabajos rebajos realizados hasta el mes de ABRIL 2022 de Mayores metrados No. 4 en la via ramal dentro de las progresivas KM. 136+780 al km. 139+697.05, donde en 60 metros se ha realizado el corte de excavación en material de roca suelta. Se realiza la constatación con los especialistas de trazo y topografía de la Supervisión y Contratista de Supervisión donde se verifica las actividades ejecutadas hasta el mes de Abril 2022.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

06-05-2022

**Actividades:**

PROGRESIVAS KM. 139+600 AL KM. 139+660 ( PROGRESIVA KM.139+640)  
VISITA DE CONSTATAACION DE LABORES DE MAYORES METRADOS: MAYOR  
METRADO No. 4 KM. 136+780 AL KM. 139+697.05 DE LA VIA RAMAL:

**CDescripcion :**

En la Progresiva Km. 139+640 se realiza la visita de constatación in situ de trabajos rebajos realizados hasta el mes de ABRIL 2022 de Mayores metrados No. 4 en la via ramal dentro de las progresivas KM. 136+780 al km. 139+697.05, donde en 60 metros se ha realizado el corte de excavación en material de roca suelta. Se realiza la constatación con los especialistas de trazo y topografía de la Supervisión y Contratista de Supervisión donde se verifica las actividades ejecutadas hasta el mes de Abril 2022.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

06-05-2022

**Actividades:**

PROGRESIVAS KM. 139+600 AL KM. 139+660 ( PROGRESIVA KM.139+660)  
}VISITA DE CONSTATAACION DE LABORES DE MAYORES METRADOS: MAYOR  
METRADO No. 4 KM. 136+780 AL KM. 139+697.05 DE LA VIA RAMAL:

**CDescripcion :**

En la Progresiva Km. 139+660 se realiza la visita de constatación in situ de trabajos rebajos realizados hasta el mes de ABRIL 2022 de Mayores metrados No. 4 en la via ramal dentro de las progresivas KM. 136+780 al km. 139+697.05, donde en 60 metros se ha realizado el corte de excavación en material de roca suelta. Se realiza la constatación con el especialista de trazo y topografía : ing, Cesar Leandro de la Supervisión y el especialista de trazo y topografía : Ing. Juan Carlos Pacco Huaman por la Contratista de Supervisión donde se verifica las actividades ejecutadas hasta el mes de Abril 2022.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

06-05-2022

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 140+530 A KM. 140+560

VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES VALORIZADAS MES ABRIL -  
CONTRATISTA: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUIDO ( LADO  
IZQUIERDO)501.A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'C = 45 KG/CM2 ( PA-  
VIMENTADORA)**CDescripcion :**

En la progresiva Km. 140+530 a Km. 140+560 se realiza visita de verificación de las actividades incluidas de la valorización No. 37 ( MES DE ABRIL 2022) donde esta actividades se realizaron después del 15-12-2021 y luego se suspendió actividades hasta el 21-03-2022. Se realiza visita in situ y se verifica el pavimento de concreto hidráulico construido con pavimentadora que se incluye en la Valorización No. 37 del Contratista. Se verifico estas actividades realizadas con la presencia de la Supervisión y Contratista.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografia:**

06-05-2022

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 147+890 AL KM. 147+980

200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS

205.C EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

**CDescripcion**

:

En las progresivas Km. 147+890 al Km. 147+980 se realiza la excavación en explanaciones en roca fija , se utiliza una excavadora de oruga con accesorio de demolición 1 excavadora de oruga. trabajan: 1 capataz, 2 operador, 2 obreros, 2 vigías

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

06-05-2022

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 153+610 A KM. 153+635

VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES VALORIZADAS MES ABRIL -  
CONTRATISTA: SOBREALCHO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO  
CONSTRUIDO ( LADO DERECHO)

501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'C = 45 KG/CM2 ( MANUAL)

**CDescripcion :**

En la progresiva Km. 153+610 a Km. 153+635 se realiza visita de verificación de las actividades incluidas de la valorización No. 37 ( MES DE ABRIL 2022) donde esta actividades se realizaron después del 15-12-2021 y luego se suspendió actividades hasta el 21-03-2022. Se realiza visita in situ y se verifica el sobre ancho de pavimento de concreto hidráulico construido manualmente que se incluye en la Valorización No. 37 del Contratista. Se verifico estas actividad tangible realizada, con la presencia de la Supervisión y Contratista

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografia:**

06-05-2022

**Actividades:**

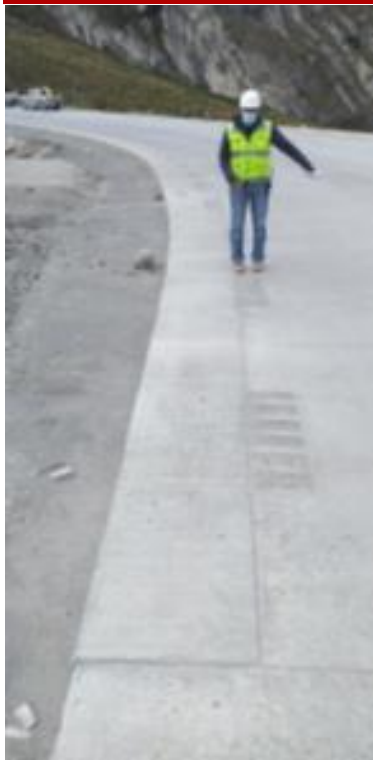
PROGRESIVA KM. 153+670 A KM. 153+795

VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES VALORIZADAS MES ABRIL -  
CONTRATISTA: SOBREALCHO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO  
CONSTRUIDO ( LADO IZQUIERDO)

501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'C = 45 KG/CM2 ( MANUAL)

**CDescripcion**

En la progresiva Km. 153+670 a Km. 153+795 se realiza visita de verificación de las actividades incluidas de la valorización No. 37 ( MES DE ABRIL 2022) donde esta actividades se realizaron después del 15-12-2021 y luego se suspendió actividades hasta el 21-03-2022. Se realiza visita in situ y se verifica el sobreancho de pavimento de concreto hidráulico construido manualmente que se incluye en la Valorización No. 37 del Contratista. Se verifico estas actividades realizadas con la presencia de la Supervisión y Contratista.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografia:**

06-05-2022

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 153+905 A KM. 154+005 Y PROGRESIVA KM. 153+925 A KM. 153+935 ( S.A)

VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES VALORIZADAS MES ABRIL - CONTRATISTA: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUIDO Y SOBREALCHO( LADO IZQUIERDO)

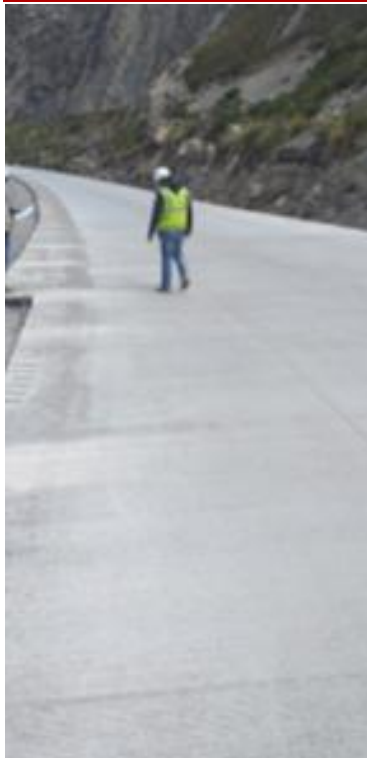
501.A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'C = 45 KG/CM2 (PAVIMENTADORA)

501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'C = 45 KG/CM2 ( MANUAL)

**CDescripcion :**

En la progresiva Km. 153+905 a Km. 154+005 se realiza visita de verificación de las actividades incluidas de la valorización No. 37 ( MES DE ABRIL 2022) donde esta actividades se realizaron después del 15-12-2021 y luego se suspendió actividades hasta el 21-03-2022. Se realiza visita in situ y se verifica el pavimento de concreto hidráulico construido con pavimentadora y sobreancho construido en el lado izquierdo en las progresivas km. 153+925 a Km. 153+935 manualmente, que se incluye en la Valorización No. 37 del Contratista. Se verifico estas actividades realizadas con la presencia de la Supervisión y Contratista.

11

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografia:**

06-05-2022

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 153+960 A KM. 153+987

VISITA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES VALORIZADAS MES ABRIL -  
CONTRATISTA: SOBREALCHO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO  
CONSTRUIDO ( LADO IZQUIERDO)

501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'C = 45 KG/CM2 ( MANUAL)

**CDescripcion**

En la progresiva Km. 153+960 a Km. 153+987 se realiza visita de verificación de las actividades incluidas de la valorización No. 37 ( MES DE ABRIL 2022) donde esta actividades se realizaron después del 15-12-2021 y luego se suspendió actividades hasta el 21-03-2022. Se realiza visita in situ y se verifica el sobrealcho de pavimento de concreto hidráulico construido manualmente que se incluye en la Valorización No. 37 del Contratista. Se verifico estas actividades realizadas con la presencia de la Supervisión y Contratista.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

06-05-2022

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 156+950

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL TRAMO I: MOVILIZACION DE  
PAVIMENTADORA EN LA VIA**CDescripcion** :En la progresiva km. 156+950 se que la Contratista esta movilizando una  
PAVIMENTADORA en la via desde cachipampa hacia la zona baja**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografia:**

06-05-2022

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 181+000

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL FINAL DEL TRAMO I: DESVIO CERRO DE PASCO

**CDescripcion**

:

En la progresiva Km. 181+000 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al final del tramo I: Desvío Cerro de Pasco. donde se verifica el buen tiempo, es soleado, se observa la plataforma de la vía seca con presencia de polvo

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

06-05-2022

**Actividades:**

PROGRESIVA KM. 164+640 AL KM. 164+740  
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE  
605.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS  
605.B MATERIAL FILTRANTE

**CDescripcion**

:

En las progresivas Km. 164+640 al Km. 164+740 se realizo la colocación de material filtrante, en donde se coloco geotextil y se realiza relleno utilizando 1 mini cargador frontal, 3 vibro apisonadores, 1 apisonador tipo plancha y la colocación del material filtrante y de relleno se realizo utilizando un mini cargador , trabajan: 1 capataz, 1 operadores y, 5 obreros, 2 vigías.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

06-05-2022

**Actividades:**

PROGRESIVAS KM. 152+980 AL KM. 153+300  
300.0 SUB BASE Y BASES  
303.A SUB BASE GRANULAR

**CDescripcion**

:

En la progresiva Km. 152+980 AL km. 153+300 del tramo I, se realiza la construcción de sub base granular Se utiliza 1 motoniveladora y 1 compactadora de rodillo. trabajan: 1 capataz, 2 operadores,, 4 obreros, 2 vigías

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Fotos:**
