

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:		
Si	22	10 - 06 - 2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU, ITEM B: "CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL Y ACCESOS"

CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERA CUSCO integrado por las empresas CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO. LTD. SUCURSAL DEL PERÚ y GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. (CONTRATO N° 057-2021-MTC/20.2)

SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR SANTA TERESA integrado por las empresas OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C. y R & Q INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU (CONTRATO DE SUPERVISION N° 035-2021-MTC/20.2)

Monto del Contrato de Ejecución de Obra: S/ 166 167 111.89

Plazo de la Ejecución de Obra: 900 Días calendario

Inicio del Plazo de Ejecución de Obra: 23 de junio del 2021

Termino de plazo vigente: 10 de abril del 2024

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****0) CUADERNO DE OBRA:**

Se informa que a la fecha el último registro obtenido del cuaderno de obra corresponde a la anotación del Asiento N° 391 Del Contratista, el cual se adjuntó en el reporte del SIGVIAL de fecha 08-06-2022.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha No se han autorizado Ampliaciones de Plazo de la Ejecución de Obra.

Es pertinente informar que La Entidad autorizó la Suspensión de la Ejecución de Obra en el periodo desde el 10 de julio de 2021 hasta el 09 de noviembre de 2021, por lo que el plazo de ejecución de obra se reinició el 10 de noviembre de 2021.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se han tramitado alrededor de cuatro expedientes adicionales y se han autorizado dos expedientes adicionales.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad por el asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha solicitado al contratista la documentación sustentatoria de sus solicitudes de mayores metrados.

4) DEDUCTIVOS:

La Entidad solo ha aprobado un presupuesto deductivo N° 01 vinculante al Adicional de Obra N° 01

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo DISAL

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se esta regando las zonas de trabajo con camión cisterna de agua.

7) RECURSOS OFERTADOS:

Se esta verificando los recursos de personal profesional de la empresa contratista y los recursos de personal y equipos de la empresa supervisora.

8) INCIDENTES:

Se ha tomado conocimiento por parte de la Supervisión de Obra que un grupo de su personal ha sido detectado con sintomatología del COVID-19 y han activado su protocolo de cuarentena para evitar la propagación de la pandemia.

Se constató el incidente de la oposición a los trabajos con maquinaria en el sector del túnel de salida en el km 8+050, la oposición está representada por los pobladores sr. Sergio Tumpay Lopez y Evangelina Tumpay Lopez manifestando su reclamo verbal por la falta de pago del PACRI de sus predios por parte de Provias Nacional. se informó verbalmente dicho incidente al supervisor de obra y este manifestó que solicitó a Provias Nacional el estado situacional de las liberaciones por PACRI del proyecto.

10) ARQUEOLOGÍA:

La Supervisión de Obra menciona que está a la espera del Pago para el CIRA a cargo de Provias Nacional para el tramite de Incorporar una nueva área auxiliar para usarlo como DME en el sector denominado "VALDIVIA".

11) OTROS:

Se visualiza que se vienen desarrollando las actividades actuales de la ejecución del contrato de obra y de la empresa de supervisión sin incidentes y con normalidad solo en los Frentes del Km 6+240 y del Km 7+100 y en las áreas auxiliares del Km 4+980.

Se informa que se viene trabajando en la Ejecución de la Obra a Doble turno, en horario diurno y en horario nocturno.

Se informa que existe un control de restricción del tránsito por parte de la contratista de la obra de la Carretera limitando solo el pase vehicular a la zona de la obra en horarios de 9:00 am a 9:30 am y 12 pm a 1:00 pm y 3:00 pm a 3:30 pm en el horario diurno y de 6:00 pm a 7:00 pm y 12 am a 1:00 am en el horario nocturno.

La Contratista y Supervisión vienen evaluando proponer las alternativas de solución debido a las diferencias del Expediente Técnico con lo encontrado en campo como son los casos de:

1.- Diferencias de la Información del Expediente Técnico de Obra con los resultados en campo informados por el Contratista respecto al suelo de Fundación de la Alcantarilla MCA del Km 6+200

2.- Diferencias de la Información del Expediente Técnico de Obra con los resultados en campo informados por el Contratista respecto a suelo de Fundación del Muro de Concreto del Km 8+050.

3.- Sector inadecuado propuesto por el Expediente Técnico de Obra para la ubicación de la Central de Control del Túnel.

Recomendaciones:

- Se recomienda a la administración de contratos de Provias Nacional programar reuniones virtuales ZOOM con la participación del Contratista y la Supervisión para evaluar los asuntos pendientes por regularizar de aspectos ambientales, arqueológicos y/o interferencias PACRI para minimizar sus riesgos de afectación al plazo de ejecución de obra.
- Se recomienda a la administración de contratos de Provias Nacional programar reuniones virtuales ZOOM con la participación del Contratista y la Supervisión para evaluar los asuntos de las diferencias de información en campo con las mencionadas en el Expediente Técnico de Obra para optimizar la búsqueda de las soluciones técnicas necesarias para alcanzar las metas del proyecto.

Auditoria Fecha De Creación:

10-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

11-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO**Panel Fotográfico****Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Nivel:**

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

10-06-2022

Actividades:

VIA DE ACCESO DE LA SALIDA DEL TUNEL EN EL KM 8+020

CDescripcion

SE CONSTATÓ QUE SE VIENEN REALIZANDO LA EVALUACION DE LA PROYECCION DE LAS ESTRUCTURAS INDICADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL FRENTE DE LA VIA DE ACCESO DE LA SALIDA DEL TUNEL EN EL KM 8+020 CON LA PARTICIPACION DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA Y DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

1

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

10-06-2022

Actividades:

BAHIA DE ESTACIONAMIENTO DEL TUNEL DE LA PROGRESIVA DEL KM 7+100

CDescripcion :

SE CONSTATÓ QUE SE VIENEN REALIZANDO TRABAJOS DE PERFORACIÓN, VOLADURA, ELIMINACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE Y SOSTENIMIENTO EN EL FRENTE DE LA BAHIA DE ESTACIONAMIENTO DEL TUNEL DE LA PROGRESIVA DEL KM 7+100.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**


10-06-2022

Actividades:

OPOSICIÓN A LOS TRABAJOS CON MAQUINARIA EN EL SECTOR DEL TÚNEL DE SALIDA EN EL KM 8+050

CDescripcion :

SE CONSTATÓ EL INCIDENTE DE LA OPOSICION A LOS TRABAJOS CON MAQUINARIA EN EL SECTOR DEL TUNEL DE SALIDA EN EL KM 8+050, LA OPOSICION ESTA REPRESENTADA POR LOS POBLADORES SR. SERGIO TUMPAY LOPEZ Y EVANGELINA TUMPAY LOPEZ MANIFESTANDO SU RECLAMO VERBAL POR LA FALTA DE PAGO DEL PACRI DE SUS PREDIOS POR PARTE DE PROVIAS NACIONAL. SE INFORMO VERBALMENTE DICHO INCIDENTE AL SUPERVISOR DE OBRA Y ESTE MANIFESTÓ QUE SOLICITÓ A PROVIAS NACIONAL EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS LIBERACIONES POR PACRI DEL PROYECTO.

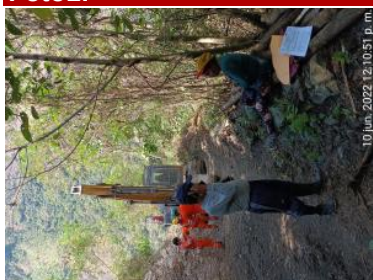Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**


10-06-2022

Actividades:

ENTRADA DEL TUNEL SUBTERRANEO EN EL KM 6+240

CDescripcion :

SE CONSTATÓ QUE SE VIENEN REALIZANDO LOS TRABAJOS PARA LA EXCAVACIÓN CON EQUIPO EXCAVADORA EN EL FRENTE DE ENTRADA DEL TUNEL SUBTERRANEO EN EL KM 6+240

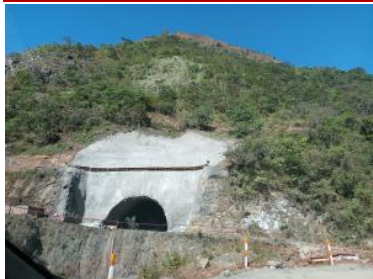Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

10-06-2022

Actividades:

CONTROL DEL PERSONAL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA

CDescripcion :

SE REALIZÓ EL CONTROL DE ASISTENCIA EN EL SITIO DE LAS OBRAS DEL PERSONAL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA CONSORCIO CARRETERA CUSCO, EN SUS OFICINAS Y EN CAMPO, LOCALIZADAS EN EL SITIO DE LAS OBRAS.

5

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2022


Actividades:

VERIFICACION DE LOS RECURSOS DEL SUPERVISOR DE OBRA

CDescripcion :


SE REALIZÓ LA VERIFICACION DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA DE SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO SUPERVISOR SANTA TERESA EN EL SITIO DE LAS OBRAS.

Foto1:

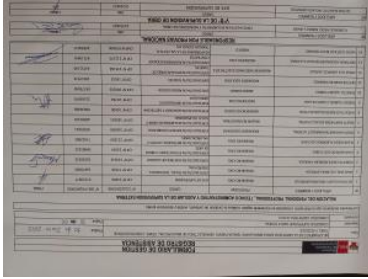

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

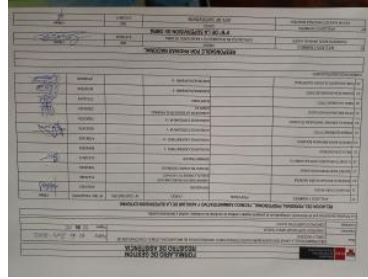

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)
