



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	127- 2022 - NAC M - ESC -DO PVN - MTC	22 - 06 - 2022	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME N° 127-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MIERCOLES 22 DE JUNIO DEL 2022

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 76+980 AL KM 78+100

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN

CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR

FRONTAL, 01 VOLQUETE.

RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

22-06-2022

Auditoria Fecha De Edición:

23-06-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

22-06-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 77+480 AL KM 78+000

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

22-06-2022

Actividades:


UBICACION : PROGRESIVAS KM 76+920 AL KM 77+480

CDescripcion _____ :

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA EXISTENTE.

2

Foto1:

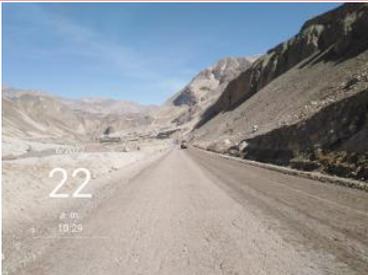

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)
