



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	128-2022 - NAC M - ESC - DO PVN - MTC	23 - 06 - 2022	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>					

#### Asunto:

INFORME N° 128-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL JUEVES 23 DE JUNIO DEL 2022

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 79+500 AL KM 80+500

#### RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN

CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR

FRONTAL, 01 VOLQUETE.

#### RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

### Recomendaciones:

NINGUNA.

**Auditoria Fecha De Creación:**

23-06-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

24-06-2022

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

23-06-2022

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 79+500 AL KM 80+500

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01  
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO  
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

24-06-2022

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO KM 79+500 AL KM 80+500

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA EXISTENTE.


2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

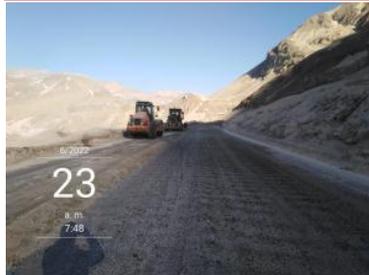

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)
