

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	062-2022- - ABA NCA Y - NAC M - ESC -DO PVN - MTC	09 - 11 - 2022	VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY (TRAMO PRELIMINAR)	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 062-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MARTES 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /  
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Conclusiones:

SE REINICIA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+240 AL KM 01+000

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)  
ING. RESIDENTE DE OBRA  
ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES  
ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD  
ADMINISTRADOR DE OBRA.  
ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARIA  
ENCARGADODE ALMACEN  
ENFERMERA  
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA  
GUARDIANES.

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:  
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO (INGENIERO)  
MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN  
CISTERNA AGUA, 01  
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

### Recomendaciones:

NINGUNA.

**Auditoria Fecha De Creación:**

09-11-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

10-11-2022

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

09-11-2022

**Actividades:**

UBICACION: OFICINAS DE LEONPAMPA PROGRESIVA KM 06+200

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

OFICINAS DE LA RESIDENCIA DEL CONTRATISTA.  
PERSONAL ESPECIALISTAS, TECNICOS Y SEGURIDAD.

**Foto1:**




[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

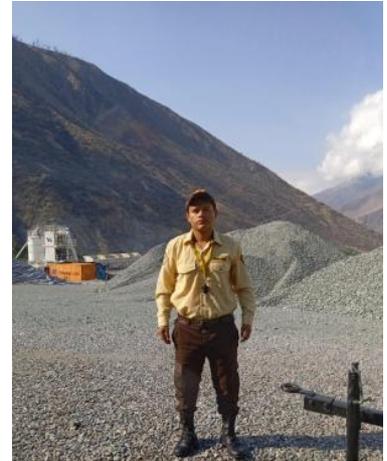

[Ver imagen completa](#)

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

09-11-2022

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 0+240 AL KM 01+000

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA PARA DAR TRANSITABILIDAD A LA VIA.

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)
