



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 65 - 2019	<b>Fecha Informe:</b> 13-04-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> HUANUCO - HUALLANCA (T1)	<b>Personal Encargado:</b> WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Actividades del día 13-04-2019

**Conclusiones:**

- Continúan actividades de topografía y georeferenciación por el contratista y supervisor
- También continúan los trabajos de movimiento de tierras, excavación de material suelto en km. 46+500 y 47+000 y traslado de sus excedentes al DME-C del km. 52+730
- En DME-C del km. 52+730 se continúa con los trabajos de conformación del material excedente, proveniente de los cortes en el km. 46+500 y 47+000, mediante tractor sobre orugas CAT
- Desde ayer se viene retirando y acumulando capa top soil en DME-B 52+730 y acondicionamiento de DME-51C en km. 51+000
- Continúa también los trabajos de tarrajeo e instalación de cobertura liviana en ambientes del campamento km. 37+720

**Recomendaciones:**

Continuar con los trabajos de movimiento de tierras e ir previendo el inicio de las actividades de la ruta crítica previstas para el mes de mayo 2019, entre ellas excavación en roca.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

WILSON NESTOR  
ARQUIÑIGO TRUJILLO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-04-2019

**Actividades:**

topografía y Georeferenciacion.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

nivelación topográfica por el contratista CR20 en Km 16+800

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

13-04-2019

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-04-2019

**Actividades:**  
topografía y Georeferenciacion.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
nivelación topográfica por el contratista CR20 en Km 18+000

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-04-2019

2



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

WILSON NESTOR  
ARQUÍNIÑO TRUJILLO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-04-2019


**Actividades:**

topografía y Georeferenciacion.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

verificación nivelación topográfica por el supervisor LB-HOB. Km 36+100

**Foto1:**

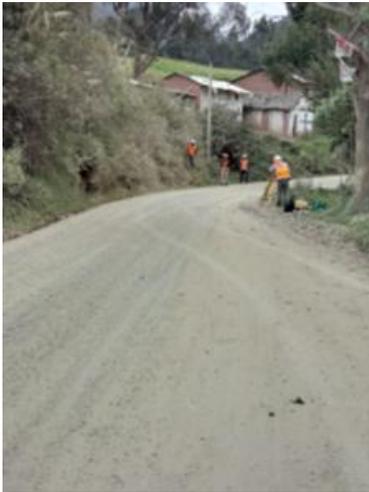

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

13-04-2019

3



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 13-04-2019

**Actividades:**  
 Acondicionamiento campamento y patio maquinas en km. 37+720.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Revestido de muros ladrillo con mortero y techado con cobertura liviana, de ambientes del campamento.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 13-04-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 13-04-2019

**Actividades:**  
 disposición y conformación DME-C en km. 52+730

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 descarguio de volquetes y conformación con tractor sobreorugas. (Por efecto de neblina no se posicionó bien el GPS)

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 13-04-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-04-2019

**Actividades:**  
 disposición y conformación del DME-B en km. 52+730.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Retiro y acumulación de capa top soil con excavadora hidráulica.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 13-04-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-04-2019

**Actividades:**  
 Acondicionamiento y conformación del DME 51C en km. 51+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Adecuación de DME con tractor sobre orugas komatsu

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 13-04-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

**WILSON NESTOR  
ARQUÍÑIGO TRUJILLO**

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-04-2019

**Actividades:**

movimiento de tierras.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Excavaciones material suelto con excavadoras y carguio de excedentes en volquetes.  
Km 46+500 y Km 47+000

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

13-04-2019
