



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 67	<b>Fecha Informe:</b> 09-04-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	<b>Personal Encargado:</b> BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

Visita de seguimiento en campo de labores efectuados por el Consorcio Integración Vial y Apoyo al especialista en hidrología Ing. Victor Leandro de PROVIAS NACIONAL para la evaluación del sistema de drenaje del tramo I

**Conclusiones:**

Apoyo logístico en las actividades de evaluación del sistema de drenaje transversal mayor y menor desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 23+000 ,con el Ing. Victor leandro de PROVIAS NACIONAL Se realizo el seguimiento en campo de las actividades realizadas por el Consorcio de Integración Vial y se observaron los puntos donde ocurrieron derrumbes por las precipitaciones caídas en la zona.

**Recomendaciones:**

Se recomienda la remoción inmediata de los obstáculos y derrumbes ocasionados por las ultimas lluvias del fin de semana.  
Se recomienda la participación a la Supervisión y al Consorcio Supervisor Vial de las actividades a ejecutar en el tramo, para contar con mas apoyo logístico.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 09-04-2019


**Actividades:**  
Visita en seguimiento en campo: Evaluación hidrológica: progresiva 0+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva km 0+000 se inicia la evaluación hidrológica por parte del especialista en hidrología Ing. Víctor Leandro

**Foto1:**



**Foto2:**

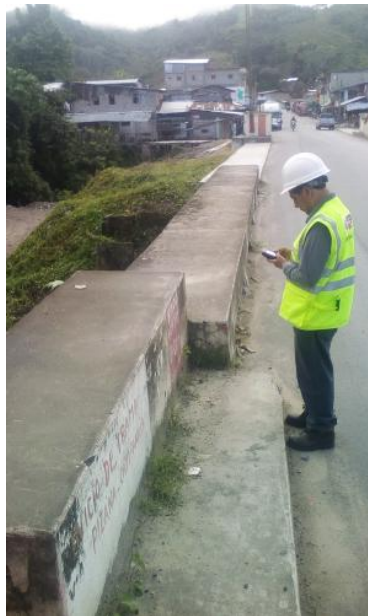

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
09-04-2019

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-04-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Evaluación hidrológica en progresiva 0+464

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva 0+ 464 se le realiza diagnostico de la alcantarilla construida tipo cajón MCA 2x2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

09-04-2019

2



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

**BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN**

**Nivel:**

**No Aplica**

**Fecha De Fotografia:**

**09-04-2019**

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: evaluación hidrológica de alcantarilla progresiva 0+674

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 0+674 se ubica la alcantarilla TMC 48"

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

**09-04-2019**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-04-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: transporte de material granular

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Desde 1500 metros adyacente a la progresiva 0+000 se ubica la cantera Michollo donde se esta transportando material granular hasta el centro de acopio en la progresiva 37+000 en el Poblado de Nuevo San martin.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
09-04-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

**BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN**

**Nivel:**

**No Aplica**

**Fecha De Fotografia:**

**09-04-2019**

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Evaluación de alcantarilla TMC 48"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 0+791 el Ing. especialista en hidraulica e hidrologia evalua una alcantarilla TMC 48" construida.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

**09-04-2019**

5



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

**BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN**

**Nivel:**

**No Aplica**

**Fecha De Fotografia:**

**09-04-2019**

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: evaluacion hidrológica de alcantarilla progresiva Km 0+872

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 0+872 se esta evaluando la alcantarilla construida de TMC 40 "

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

**09-04-2019**

6



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-04-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: evaluación de Puentes progresiva Km. 1+218

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva Km. 1+218 se evalúa un Puentes s/n de 15 metros de longitud de concreto armado.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
09-04-2019

7





**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-04-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: evaluación de alcantarilla TMC 48 progresiva 1+386

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva Km.1+386 se esta evaluando el funcionamiento y la condición física de una alcantarilla colocada de TMC 48"

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
09-04-2019

8



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-04-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Evaluación de MCA de 2x1,50m

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva KM 1+550 se evalúa una alcantarilla tipo caja o muro de 2 x1,50 m de concreto armado

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
09-04-2019

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**


09-04-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Evaluación de alcantarilla TMC 48"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En las progresivas KM 1+660 existe una alcantarilla que fue reemplazada de TMC 48" y en el KM 1+780 existe alcantarilla TMC de 48" nueva Estas alcantarillas seran evaluadas por especialista en hidráulica e hidrología.

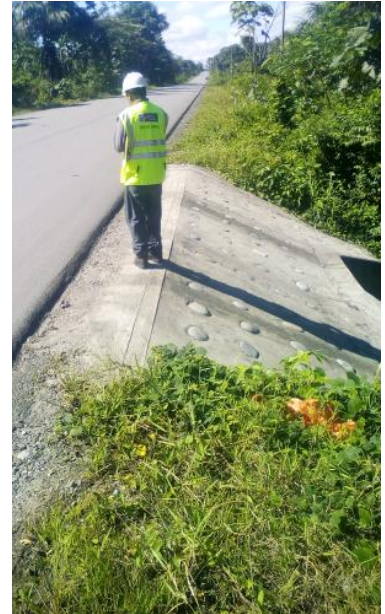**Foto1:****Foto2:****Foto3:**

10

**Fecha Toma De Datos:**

09-04-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-04-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Evaluacion hidrológica de alcantarilla progr 3+380

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM 4+780 km 5+223 y Km 5+309 se realiza la evaluación de alcantarillas TMC de 48"

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

09-04-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

**BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN**

**Nivel:**

**No Aplica**

**Fecha De Fotografia:**

**09-04-2019**

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Evaluación hidrológica a obras de drenaje mayor

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se esta realizando la evaluación hidrológica a Puentes y pontones ( drenaje transversal mayor )

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

**09-04-2019**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 09-04-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: transporte en volquetes de material granular

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

El transporte se realiza desde la cantera Michollo , utilizando 10 volquetes , Otro transporte se realiza desde la cantera ubicada en progresiva 86+540 hasta el sitio de acopio ubicado en la progresiva 79+840 donde se esta utilizando 2 volquetes, y los otros transportes se realiza desde los sitios de derrumbes hacia los DME se esta utilizando 2 volquetes

13

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
09-04-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-04-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Labores de remoción de derrumbes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

desde la progresiva 1+000 hasta la 11+000 se continua con el mantenimiento vial, como limpieza de cunetas y remoción de derrumbes.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

09-04-2019
