



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confirma Bitacora:** Si  
**Nro Informe:** 71  
**Fecha Informe:** 29-04-2019  
**Nombre De La Obra:** Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50  
**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:




Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Labores realizadas respecto a la ejecución de obra.

**Conclusiones:**

A la fecha no se cuenta con movilidad para los trabajos de campo debido al cumplimiento del periodo contratado de acuerdo a orden de servicio N° 202 de 28 de enero de 2019.

Se realiza las coordinaciones con el ingeniero Hilario Roig Boshc con la finalidad que nos apoye con movilidad para el día de mañana, por lo que se realizará el acompañamiento al equipo de trabajo del Contratista encargado del inventario y estado situacional de daños debido a precipitaciones pluviales de los meses de enero y febrero del año en curso, dado que de las coordinaciones efectuadas con el ingeniero Luis Orlando Garayar Jurado éste preciso que no contaba con unidades vehiculares y que en la única camioneta con la que cuentan irían la mayoría de sus especialistas, por tanto no se tendría espacio.

La cantidad de personal de la supervisión de obra debería ser proporcional a la cantidad de unidades vehiculares para el cumplimiento adecuado en sus funciones.

Se adjuntan fotografías de la programación semanal de obra del 29 de abril al 3 de mayo de 2019.

**Recomendaciones:**

Se sugiere contar con una movilidad para los trabajos de campo a desarrollarse, en cumplimiento de las funciones asignadas.

Se sugiere evaluar la cantidad de personal de la supervisión respecto a la cantidad de unidades vehiculares para su transporte dentro del ámbito de intervención de la obra a fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones asignadas.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-04-2019

**Actividades:**

Coordinaciones diversas en la oficina de Supervisión.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Durante el día se realizan coordinaciones en la oficina de supervisión respecto a:

Asistencia de Personal: ingenieros especialistas en metrados, costos y valorizaciones, topografía y trazo, estructuras y obras de arte y en puentes, un topógrafo, un conductor, una secretaria y cuatro auxiliares. Además en horas de la tarde arribaron a la localidad de Omate después del recorrido realizado entre las progresivas 153+500 @ 130+200 aproximadamente los ingenieros Jefe de Supervisión, especialista en geología y geotecnia y un conductor.

Programación semanal de obra, a lo que nos facilitaron una copia presentada por el contratista.

Trabajos a desarrollarse el día de mañana: con la participación de especialistas del Contratista y Supervisión se iniciara con los trabajos de inventario y estado situacional de daños debido a precipitaciones pluviales de los meses de enero y febrero del año en curso.


No se aprecia ninguna movilidad de la supervisión, y al realizar las consultas al respecto el personal preciso que la camioneta se encontraba en la ciudad de Arequipa con dirección al tramo comprendido entre las progresivas 153+500 @ 130+200 aproximadamente, respecto de la minivan el ingeniero Garayar Jefe de Supervisión indicó que esta fue arrendada únicamente en el transcurso de la semana pasada dado la presencia de especialistas.

1

**Foto1:**



**Foto2:**

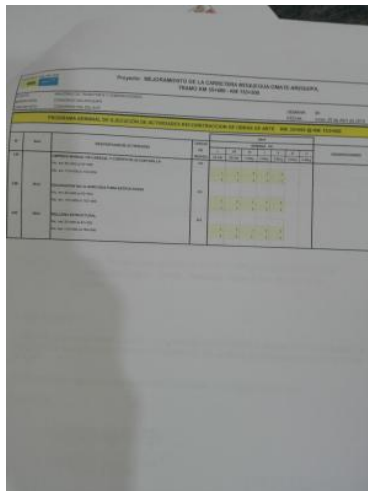

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

29-04-2019
