

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 094	Fecha Informe: 03-05-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 03 DE MAYO DEL 2019

Conclusiones:

EL CONTRATISTA HASTA LA FECHA VIENE EJECUTANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, CONTANDO CON CISTERNAS PARA EFECTUAR EL RIEGO DE LA VÍA, EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y ACCESOS; COLOCANDO LAS SEÑALES PREVENTIVAS TEMPORALES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, EN LAS ZONAS DE TRABAJO Y DESVÍOS. EL CONTRATISTA VIENE CUMPLIENDO CON MOVILIZAR LA CANTIDAD DE EQUIPOS MÍNIMOS DE ACUERDO A SU CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA IMPLEMENTAR LA IPER Y CAPACITAR A TODO EL PERSONAL EN EL CORRECTO LLENADO DE LOS ATS
MAYOR ORDEN Y LIMPIEZA EN EL PROCESO DE VACEADO DE ALCANTARILLAS.
ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE SE TIENE UNA SUSTANCIAL DISMINUCIÓN EN EL NORMAL AVANCE DE LA OBRA

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-05-2019

Actividades:
SUB BASE

CDescripcion_____:
COMPACTADO DE SUB BASE GRANULAR UBICADO EN LA PROGRESIVA Km 4+560

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-05-2019

Actividades:
SUB BASE

CDescripcion_____:
CONFORMACIÓN DE LA SUB BASE GRANULAR UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 5+260

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

Sub base

CDescripcion_____:

Transporte de material seleccionado desde cantera N 01Jallamilla km 11+000

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2019

Actividades:

Cono de arena

CDescripcion_____:

Densidad de campo ubicado en la progresiva km 10+000 corona Segunda capa.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-05-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo MCA de 3x2 m ubicado en la progresiva km 21+550, compactado relleno estructural

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-05-2019

Actividades:
PUENTE LLINQUI KM 33+740

CDescripcion_____:
Verificacion del armado de acero ing Luis Cabrera esp. en Puentes de la Supervision HOB

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-05-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI KM 33+740

CDescripcion_____:
 ING.. GLADYS CAMASCA GIRALDO ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA Y DRENAJE VIAL DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES, PROTOCOLO DE PILOTEJE


Foto1:



Foto2:



Foto3:

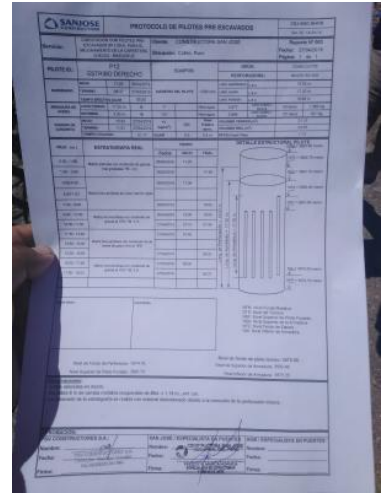

Fecha Toma De Datos:
 05-05-2019

7
